

青村镇体育公园土方外运消纳工程

项目编号：310120111260722125218-20370924（标项 1）

商 务 文 件




响应方全称：上海汪太市政工程有限公司

地 址：上海市奉贤区奉城镇爱民村 223 号

时 间：2026 年 9 月 1 日

目 录

一、投标函	2
二、声明书	4
三、法定代表人授权委托书	5
四、营业执照	6
五、报 价 明 细 一 览 表	7
六、类似成功案例的业绩一览表	9
七、企业信用状况	28
八、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函	32
九、商务响应表	42
十、 资质材料	43
十一、公司情况介绍	48
十二、节能环保等的资质证书或文件	50
十三、 中小企业声明函	52
十四、残疾人福利企业声明函	55
十五、磋商响应方控股情况	56
十六、其他文件资料	57



一、投标函

投标函

致：上海市奉贤区青村镇城市建设管理事务中心、上海亿越工程咨询有限公司
（招标人名称）

根据贵方 青村镇体育公园土方外运消纳工程 项目编号：310120111260722125218-20370924（标项 1）（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，周杰（商务经理）（姓名和职务）被正式授权代表投标人上海汪太市政工程有限公司 上海市奉贤区奉城镇爱民村223号（投标人名称、地址），按照网上投标系统规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为（大写）2310000（贰佰叁拾壹万元整）元人民币。

2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 投标有效期为自开标之日起 90 日。

4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。

9. 我方同意开标内容以电子采购平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。

10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

(1) 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

(2) 我方近期有关该型号货物的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项：

无

(3) 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：上海市奉贤区奉城镇爱民村223号

电话、传真：57185086

邮政编码：201411

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海奉城支行

银行账号：31050182370000000825

投标人授权代表签名：周杰

投标人名称（公章）：上海汪太市政工程有限公司

日期：2026 年 9 月 1 日



二、声明书

声 明 书

致：上海亿越工程咨询有限公司

上海汪太市政工程有限公司（磋商响应方名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址上海市奉贤区奉城镇爱民村223号。

我沙立利（姓名）系上海汪太市政工程有限公司（磋商响应方名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的青村镇体育公园土方外运消纳工程（编号为310120111260722125218-20370924）的磋商响应，为此，我方就本次磋商响应有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部磋商文件，同意竞争性磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是正确和真实的。

3、若成交，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构。

5、磋商响应书自磋商日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名或签名章：



日期：2026.9.1

供应商全称（公章）：上海汪太市政工程有限公司



三、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

上海亿越工程咨询有限公司：

我 沙立利（姓名）系 上海汪太市政工程有限公司（响应方名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 周杰（姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：310120111260722125218-20370924 项目名称：青村镇体育公园土方外运消纳工程 项目的竞争性磋商响应活动，并代表我方全权办理针对该项目的响应、磋商、评审、等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。



全权代表签名：周杰 职务：商务经理

全权代表身份证号码：310226198902215515

法定代表人签名或签名章：沙立利 职务：总经理

供应商全称（公章）：上海汪太市政工程有限公司 日期：2026.9.1

四、营业执照

营业执照



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310120MA1H1PFWA42

证照编号: 26000000202508070739

名称 上海庄太市政工程有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 沙立利

经营范围 许可项目: 建设工程施工; 住宅室内装饰装修; 公路管理与养护; 道路货物运输(不含危险货物)。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 土石方工程施工; 园林绿化工程施工; 市政设施管业; 水污染治理; 机械设备租赁; 住宅水电安装维护服务; 物业管理; 劳务服务(不含劳务派遣)。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

扫描二维码
下载电子营业执照
或办理相关业务



注册资本 人民币2000.0000万元整

成立日期 2018年07月12日

住所 上海市奉贤区奉城镇爱民村223号

登记机关

2025 年 08 月 07 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



五、报价明细一览表

报价明细一览表

磋商响应方全称（公章）：上海汪太市政工程有限公司

项目编号及标项：310120111260722125218-20370924（标项 1）

青村镇体育公园土方外运消纳工程包 1

项目负责人	单价	服务周期	备注	最终报价 (总价、元)
胡威	77元/m ³	总工期 60 日历天	卸点费固定 15 元 /m ³ ；综合单价 = 外运成本单价 + 15 元 /m ³ ；按实际合格方量结算，最终财政审定价为准	总报价2310000 元

说明：

(1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

(2) 经测算可回填土方约 3 万方，可作体育公园土方外运消纳卸点。本项目为综合外运处置暂定单价，其中包含外运费及属地村卸点费固定 15 元/m³，最终按实结算。

投标报价明细表

报价清单

项目名称：青村镇体育公园土方外运消纳工程

项目编号：310120111260722125218-20370924（标项 1）

单位：元

序号	明细内容	单位	数量（暂定）	含税单价	含税总价（元）	备注
1	土方开挖、外运、奉贤区第三方管理服务费	m³	30000	62.00	1860000.00	土方外运发生的一切行为均包含在内
2	指定属地村回填卸点费	m³	30000	15.00	450000.00	
	合计	m³	30000	77.00	2310000.00	
						以上报价包含9%增值税专用发票

报价单位

日期



六、类似成功案例的业绩一览表

磋商响应方同类项目实施情况一览表

供应商全称（公章）：上海汪太市政工程有限公司



采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额（万元）	附件页码		采购单位联系人及联系电话
					合同	验收报告	
上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）	工程服务合同-海港综合经济开发区 FXS5-0202 单元 44-02 地块土方清运			705.1602			翁经理 13621988390
中化学交建(上海)工程有限公司	奉贤新城17单元 09-03号地块(智汇未来)项目-土方工程			5501.0843			周经理 13391276526
上海奉贤建筑设计有限公司	金汇镇泰日社区01D-02地块的土方开挖和外运			624.00			翁卫忠 13311831586
中天建设集团有限公司	上海市之奉贤新城23亩项目土方工程			1506.6522			卢于隆 13916903595
上海奉贤二建股份有限公司	奉贤区庄行镇FXS3-0101单元36-03地块征收安置房项目土方施工工程	93500m³	155元/m³	1449.2500			杨经理 13681769242
备注	须提供磋商响应方同类项目合同复印件、用户验收报告。						

注：格式可自拟。

全权代表签名：[Signature]

时 间： 2026.9.1

近三年业绩

1. 工程服务合同-海港综合经济开发区 FXS5-0202 单元 44-02 地块土方清运

工程服务合同

合同统一编号: 11N75859564220261001

项目名称: 海港综合经济开发区 FXS5-0202 单元 44-02 地块土方清运

委托人(甲方): 上海市临港新片区规划土地事务中心(上海市土地储备中心临港分中心)

受托人(乙方): 上海汪太市政工程有限公司

签订地点: 上海市(市)浦东新区(县)

签订日期: 2026年04月17日

2026年04月17日

依据《中华人民共和国民法典》等相关规定，合同双方就 **海港综合经济开发区 FXS5-0202 单元 44-02 地块土方清运** 工程服务，经协商一致，签订本合同。

一、服务内容、要求和方式：

1.服务内容：对海港综合经济开发区 FXS5-0202 单元 44-02 地块的土方进行清运，该地块东至港文路西侧绿化带，南至海杰路北侧绿化带，西至 44-01 地块，北至海熙路，地块面积约 9.4646 公顷（以测绘报告面积为准）。乙方须按行业主管部门要求办理相关手续后将土方运至甲方指定卸点（东至洋山围网、南至海港大道、西至渔港路、北至胜利塘路）并按要求完成平整工作，服务期内清运量约为 66177.4 立方米。

2.服务要求：合同签订之日起 45 个自然日内完成。

3.工程服务方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收通过。

二、履行期限、地点和方式：

1.本合同自签订之日起 45 个自然日内完成所有工作内容在临港新片区履行，乙方中途无故停工，影响合同履行期限的，期限不顺延。

2.本工程服务完成后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后及时组织验收，验收通过后即视为本工程服务完成。

三、甲方、乙方的权利义务：

1.甲方（委托人）的权利义务：

1.1 工程服务完成后，及时组织验收；

1.2 按照合同约定的期限和方式向乙方支付合同价款。

2.乙方（受托人）的权利义务：

2.1 编制施工组织设计或方案，做好各项工程服务前期准备工作；

2.2 及时向甲方报开工通知书、施工进度计划和竣工验收报告等；协助甲方进行验收。

2.3 在工作期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范；

2.4 严格按施工图和施工技术规范开展工作，确保工作质量，做好各项质量检查记录。甲方要求设计变更的，按照甲方、现场监理确认签证进行施工。参加竣工验收，编制工程结算，并按照甲方要求进行竣工资料的归档。

2.5 严格把好工程技术质量关，抓好工程质量的验收工作，接受甲方监督、检查，凡分项工程、隐蔽工程未经过质量检查、未经过甲方和有关监督部门的验收或验收不合格，不得进行下道工序的施工；

2.6 做好施工现场及邻近地下管线、建筑物和构筑物、设备管线、古树名木的保护工作。避免污染、噪音或由于其施工方法的不当，造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。做好施工现场保卫和环境保护工作；

2.7 向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

2.8 未经甲方事先书面许可，不得将本工程的全部或部分分包、转包或以任何其他形式交由任何第三方实施。

2.9 严格按上海市及浦东新区有关建筑工程管理的法规、法令、规定、办法等执行，并服从本施工场地所属地区政府职能部门的管理。所有因乙方管理不善而造成安全、消防、治安、保卫、环卫、卫生、劳动保护、城管、

供电、供水、通讯等部门的处罚，由乙方负全责并承担甲方因此而引起的诉讼、纠纷、处罚、声誉损失、赔偿上述一切经济和声誉损失。

四、技术情报和资料的保密：

- 1.乙方需对合同履行期间甲方提供的资料承担保密义务，未经甲方书面许可，不得擅自泄露。
- 2.本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

五、验收、评价方法：

本工程服务质量需符合地表无杂物、无植被、无生活垃圾、地块平均标高符合甲方要求同时需符合国家及上海市相关法律法规及行业规范，由甲方出具项目验收证明。

六、报酬及支付方式：

1.本项目全部费用为人民币 **7051602.51** 元（大写：**柒佰零伍万壹仟陆佰零贰元伍角壹分**）（本合同所述价款应包括从工程服务开始至经甲方验收合格期间的所有人工费，材料费，施工机械使用费，管理费，利润、税金等乙方为履行本合同所需的所有费用）。

2.支付方式：

- 2.1 本项目合同采用单价合同，如招标实施内容或工程量发生变化，最终结算价若超过合同价，则按合同价计；最终结算价若小于合同价，则按实际审定审计价格计；
- 2.2 合同签订后，甲方向乙方支付合同价的 30%作为预付款；
- 2.3 项目竣工验收合格审价完成后，甲方累计申请拨付审定价格的 80%；
- 2.4 正式出具审计报告后，按照审计报告支付尾款。

注：以上资金支付均需待甲方收到管委会拨付的财政资金后 10 个工作日内，由甲方向乙方支付。

七、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

1.因乙方原因导致本项目所在地设备、管线等遭到破坏的，由此发生的损失或事故，由乙方负责并承担责任（包括罚款）。

2.乙方人员作业时未按甲方安全管理规定或其他相关安全管理制度导致人员伤亡或造成其他财产损失的，相关损失全部由乙方承担。

3.乙方不能按照本合同约定期限完成工作的，每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同价款的万分之五作为违约金。

4.甲方经验收发现因乙方原因本工程服务质量无法达到本合同约定的质量标准的，乙方应自费进行整改直至甲方满意，造成逾期的违约责任，由乙方自行承担。

5.发生以下情形，甲方有权解除合同不支付任何费用并要求乙方承担合同价款 20%的违约金：

- 5.1 非因甲方原因，乙方逾期完工或开工超过 15 天的；
- 5.2 未经甲方事先书面许可，将本工程服务的全部或部分分包、转包或以任何其他方式交由任何第三方实施的。
- 5.3 其他严重违约事宜。

6.除本合同另有规定外，本合同一方违反本合同其他约定的，每违约一天，应向守约方支付本合同价款的万分之五作为违约金直至违约状态终止。

10.应当加强施工现场日常的安全巡视和检查，督促施工人员遵守相关施工作业安全要求的规定，发现安全事故隐患以及违反施工安全技术标准或者安全操作规程的行为，及时予以制止或者纠正。采取措施有效杜绝事故苗子和隐患，预防和避免人身伤害事故。

11.必须采取措施重点做好高处坠落或坠物伤人事故；必须做好防触电和防止发生火灾事故。

12.在施工期间承担工程施工区域防火、防台防汛、防不稳定因素、防治刑事案件、保安全（简称“四防一保”）的责任，具体要求如下：

a)应严格遵守上海市有关用工规定，不招用劳改、劳教、逃犯、因案在逃对象和三无（无合法证件、无固定住所、无正常职业）盲流人员及传染病患者，加强内部治安治理，防止违法犯罪活动发生。

b)保护施工区域内防火、防台、防汛设施和设备，如有损坏应立即报告主管部门并及时予以修复；

第三条（安全管理工作的上报）

乙方在本工程施工前，应将本安全管理条款上报政府安全生产监督管理部门备案，并将施工安全管理责任人名单报政府建设行政管理部门以及劳动和社会保障行政部门备案。

乙方应自施工人员进驻施工现场之日起，建立“四防一保”领导小组，落实专人负责此项工作，领导小组名单应抄送甲方。

乙方应及时与本工程所在地警署签订《治安治理责任承包协议书》，并予以执行，其协议书副本报送甲方。

第四条（施工伤亡事故及违法违纪事故的责任）

在本工程施工过程中，若发生任何人身伤亡生产安全事故，包括第三者责任安全事故，均由乙方负全部责任。并且由乙方的上级行政主管单位负责承担工伤事故死亡指标。

乙方人员如因违法违纪，受到法律或治安处罚条例处置，乙方应自行承担相应责任。

第五条（施工意外人身伤亡事故的报告和处理）

1.在本工程施工过程中若发生施工意外人身伤亡事故的，乙方必须在上海市相关规定的时限内，主动及时地向政府安全生产管理部门、公安部门、检察机关、工会及有关管理单位报告。

2.若发生施工意外人身伤亡事故，乙方必须负责妥善处理事故的善后相关事宜，由乙方按照国家及上海市有关规定负责做好全部事故赔偿工作。

甲方：上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）（盖章）
法定代表人（或授权代表）：陈瑞慧

乙方：上海汪太市政工程集团有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）：袁海

2026年04月17日

2026年04月17日

日期：

2. 奉贤新城17单元 09-03号地块(智汇未来)项目-土方工程

建设工程施工合同

(2023 标准专业版)

合同编号: ZHIG2024-002-14Z

工程名称: 奉贤新城 17 单元 09-03 号地块(智汇未来)项目-土方工程

甲 方: 中化学交建(上海)工程有限公司

乙 方: 上海汪太市政工程有限公司

签订时间: 年 月 日

第一部分 协议书

甲方：中化学交建（上海）工程有限公司

乙方：上海汪太市政工程有限公司

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》以及《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》等有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程项目分包工程施工事项协商一致后，订立本合同：

1、分包工程范围和内容

1.1 总包工程名称：奉贤新城 17 单元 09-03 号地块（智汇未来）项目

1.2 分包工程名称及地点：土方工程；奉贤区金海社区（四至范围：东至：金海公路 西至：诺尔康 南至：汇丰北路 北至：大叶公路）

1.3 分包工程承包范围及工程内容：本项目图纸范围内土方开挖、场内运输、场外运输及处置、回填土、办理土方施工相关的手续等工作（以签发的施工图及指令为准）

2、工期要求

2.1 计划开工日期 2024.09.10 计划完工日期 2025.03.25，施工总工期为 190 日历天。

其中本承包内容关键工期节点为 /。实际开工日期以甲方书面开工令为准，并据此相应确定完工日期。

2.2 承包范围质量保修期：分包工程质量保修期的起算日期和保修期限同建设单位与甲方签订的主合同的保修期起算日期和保修期限一致，保修期为 / 年。

3、分包工程履约标准：

3.1 质量标准及目标：一次验收合格。

3.2 安全施工标准及目标：无伤亡事故。

3.3 文明施工标准及目标：达到文明工地标准。

3.4 环境保护标准及目标：必须遵守有关环境保护的法律、法规和规章制度，做好环境的保护工作，不对环境造成破坏和污染，不发生环境事故，零投诉率。

4、分包合同价款

本合同暂定含税合同金额为（人民币）：55010843.61 元（大写：伍仟伍佰零壹万捌

第一部分 协议书

甲方：中化学交建（上海）工程有限公司

乙方：上海汪太市政工程有限公司

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》以及《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》等有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程项目分包工程施工事项协商一致后，订立本合同：

1、分包工程范围和内容

1.1 总包工程名称：奉贤新城 17 单元 09-03 号地块（智汇未来）项目

1.2 分包工程名称及地点：土方工程；奉贤区金海社区（四至范围：东至：金海公路南至：诺尔康 南至：汇丰北路 北至：大叶公路）

1.3 分包工程承包范围及工程内容：本项目图纸范围内土方开挖、场内运输、装卸及处置、回填土、办理土方施工相关的手续等工作（以签发的施工图及指令为准）

2、工期要求

2.1 计划开工日期 2024.09.10 计划完工日期 2025.03.25，施工总工期为 196 日历天。

其中本承包内容关键工期节点为 / /。实际开工日期以甲方书面开工令为准，并据此相应确定完工日期。

2.2 承包范围质量保修期：分包工程质量保修期的起算日期和保修期限同建设单位与甲方签订的主合同的保修期起算日期和保修期限一致，保修期为 / / 年。

3、分包工程履约标准：

3.1 质量标准及目标：一次验收合格。

3.2 安全施工标准及目标：无伤亡事故。

3.3 文明施工标准及目标：达到文明工地标准。

3.4 环境保护标准及目标：必须遵守有关环境保护的法律、法规和规章制度；做好环境的保护工作，不对环境造成破坏和污染，不发生环境事故，零投诉率。

4、分包合同价款

本合同暂定含税合同金额为（人民币）：55010843.61 元（大写：伍仟伍佰零壹万捌

伍肆拾叁元陆角壹分)。乙方自行承担分包范围内的规费和税金。最终结算价根据合同约定的条款进行结算,且结算工程量不应超过建设单位审核给甲方的工程量。

乙方应提供符合国家有关政策法规规定的真实有效的足额的增值税专用发票,因乙方提供税务机关不认可的非正规发票或虚假发票,由此而造成的罚款或其他一切损失,均由乙方承担,甲方有权在乙方工程款支付中直接扣除相关损失。因国家税收政策调整而产生的额外税收成本,由乙方自行承担。

5、合同文件组成及效力

组成本合同的各项文件互相解释,互为说明。当合同相关文件出现含糊不清或不一致时,合同文件组成、条款解释、适用及效力的优先次序如下:

- (1) 双方商定的补充协议或合同履行期内经双方签署的其他协议(如有);
- (2) 本协议书及与本合同有关的附件或其它文件;
- (3) 乙方合同履行承诺书(如有);
- (4) 本合同专用条款;
- (5) 工程量清单(或合同费用表);
- (6) 本合同通用条款;
- (7) 甲乙双方招投标文件及乙方在招投阶段向甲方作出的相关承诺和回复;
- (8) 施工图纸、图集;
- (9) 国家、行业及工程所在地颁发的有关技术标准、规范和有关技术资料;

上述同类同效力等级的合同文件之间有任何不一致的地方,以较后时间签订的合同文件为准。本协议书有关词语的含义与本合同项下第二部分合同通用条款中相应术语的含义相同。

6、未尽事宜约定

本合同如有未尽事宜,双方应协商解决,并签订相关补充协议,且补充协议与本合同具有同等法律效力。

7、争议处理

本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;如协商不成,双方约定以下第二种方式解决。

- 一、将争议提交上海国际仲裁中心提请仲裁。
- 二、任何一方均可依法向甲方公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。

8、合同份数及生效条件

8.1 本合同一式肆份，由甲方执叁份乙方执壹份。

8.2 本合同经双方法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖公章后生效。至本合同约定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。

（此页以下无正文）



甲方（盖章）：
法定代表人或授权委托人

华赵印筑

乙方（盖章）：



法定代表人或授权委托人

利沙印立

以上合同于 年 月 日由上述甲乙双方在中国上海市松江区签署

3. 金汇镇泰日社区01D-02地块的土方开挖和外运

土方工程专业分包施工合同

编号:

发包单位: 上海奉贤建筑设计有限公司 (以下简称甲方)

承包单位: 上海汪太市政工程有限公司 (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,参照国家建设部、工商局联合制定的《建设工程施工合同》GF-2005(示范文本)有关条款,并结合本工程具体情况,为明确双方施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商一致,订立本合同。

第一条: 土方专业分包工程概况

工程名称: 金汇镇泰日社区 01D-02 地块的土方开挖和外运

工程地点: 上海市奉贤区金汇镇

工程承包范围: 土方开挖及外运运输、短驳。

分包工程量: 土方外运量(暂估) 130000 方

短驳(暂估) / 方

第二条: 合同价款

- 1、本合同土方外运单价 48 元/方(土方开挖、装点保洁、车辆运输、临时钢板和道板铺设、装点机械费、装点人工费、装点管理费、装点和卸点马路上的保洁工作、装点税金等一切费用。卸点由甲方自行提供,金汇镇境内上述价格,超出金汇镇双方再协商)
- 2、此价格不包含奉贤区第三方管理费、卸点费用、卸点机械费等关于卸点的一切费用、乙方无偿配合甲方办理渣土证等一切相关手续。
- 3、乙方回填费用同等条件下优先。

4、合同总价暂定为¥ 6240000 元。人民币（大写：陆佰贰拾肆万元整）（最终以实际工程量为准，按实结算。场地原始标高由甲乙双方开挖前确认。）

第三条：施工日期

1、开工日期：工程定于____年__月__日开工（以甲方签发的开工通知为准）
2、竣工日期：工程定于____年__月__日竣工（以乙方完成分包工程并通过验收之日为准），

3、因下列原因，乙方经甲方书面确认后，分包工程的竣工时间可相应顺延

- （1）甲方根据建设方合同已获得与本分包工程相关的竣工时间的延长
- （2）非乙方原因造成的分包工程范围内的工程变更及工程量增加。
- （3）不可抗力原因引起的分包工程工期的延误。

凡遇到上述情况，应及时办理签证手续并得到甲方与建设方的认可。

第四条：质量标准

- 1、本分包工程质量标准：符合 GB50202-2005 标准，确保一次验收合格；
- 2、分包工程施工质量应同时符合国家与地方现行规定、标准及工程图纸的要求，当各项标准值不一致时，以较高标准执行，确保工程质量不留隐患，一次合格率达到 100%；
- 3、乙方应认真按照标准、规定和施工组织设计施工，随时接受甲方代表及委派人员的检查，把好质量关；
- 4、乙方在施工中因乙方原因发生质量事故，应及时报告甲方代表并提出事故处理方案，经设计方、建设方、甲方等单位共同研究确认后，由乙方组织实施并承担相应费用；
- 5、工程具备竣工验收条件，乙方按土方工程竣工有关规定，向甲方提供相应的竣工资料和报验核准手续，并经甲方确认。

甲方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

单位地址：

电话（手机）：

传真：

日期：____年____月____日

乙方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

单位地址：

电话（手机）：

传真：

日期：____年____月____日

名称：上海汪太市政工程有限公司

账号：31050182370000000825

开户行：中国建设银行股份有限公司上海奉城支行

4. 上海市之奉贤新城23亩项目土方工程

上海市之奉贤新城 23 亩
土方工程合同



编制时间：____年__月__日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：上海贝好家诚贤置业发展有限公司

承包人（全称）：中天建设集团有限公司

分包人（全称）：上海汪太市政工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人及分包人经友好协商一致就本分包工程施工事项订立本合同。

一、工程概况

- 1.1 工程名称：上海市之奉贤新城 23 亩项目土方工程。
- 1.2 工程地点：上海市奉贤区光迎路与南港路交汇处东南角
- 1.3 工程范围：上海奉贤新城 23 亩项目土方工程

- 1.4 施工现场条件及周边环境：承包人已了解本工程之工地位置、邻近建筑物情况、土质、三通一平、储存空间、起卸限制、已完成工程以及足以影响履行合同的其它任何情况，承包人将承担因工地现场情况影响本工程施工作业之所有风险，并确认已将工地现场情况及周边环境充分考虑在合同总价内。

二、合同工期

双方确认，因本工程设计相关变更，本工程总工期为 96 个日历天（包含法定节假日），示范区计划开工日期为 2025 年 5 月 1 日，计划竣工日期为 2025 年 5 月 20 日，大区计划开工日期为 2025 年 6 月 18 日，计划竣工日期为 2025 年 8 月 4 日。最终开工日期以发包人发出的书面开工通知为准。实际开工日期先于或晚于计划开工日期，合同总工期时间不变。上述工期含节假日，除合同另

本合同三方约定：本协议自各方加盖法人公章及法定代表人签章后生效（通用条款和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分，具有同等的法律效力），签订地点为发包人住所地。

发包人：

承包人：

分包人：

（签章1）

（签章2）

（签章3）

法定代表人：

法定代表人：

法定代表人：

地 址：

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

账 号：

5. 奉贤区庄行镇FXS3-0101单元36-03地块征收安置房项目土方施工工程

土方工程分包施工合同

合同编号: ZA-BA-005

甲方: 上海奉贤二建股份有限公司

乙方: 上海汪太市政工程有限公司

甲方拟委托乙方负责奉贤区庄行镇FXS3-0101单元36-03地块征收安置房项目土方工程的分包施工任务(以下简称“本分包工程”)。甲乙双方现根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,在平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上,就本分包工程的施工及相关事项,经友好协商一致,达成如下合同条款。

一、工程概况

(一) 工程名称: 奉贤区庄行镇FXS3-0101单元36-03地块征收安置房项目土方施工工程。

(二) 工程地点: 上海市奉贤区庄行镇。

(三) 工程量发生变化, 合同单价不做调整。

(四) 承包工程范围: 本项目南区(区域划分详见后附图)施工图纸范围的土方工程。具体包括但不限于:

1. 在甲方施工部门放线规划区域内的基坑土方开挖(含甲方规定的放坡系数)、场地内原有旧混凝土基础、砖基础、异物、渣石破碎、装卸及外运, 并按照甲方要求进行土方回填和土方夯实。

2. 图纸范围内的从自然地坪开始至甲方指定深度为止范围内的挖土、装车、外运、卸土、清理机下余土、修理边坡、垫层土面修整精平、表面及暗藏障碍物的清除、暗浜的处理、土场地表面混凝土硬化地坪的凿除与挖运、场地清理工作、场地内及围墙外所有道路的保洁等工作, 负责办理渣土证等相关手续及所发生的一切费用。

3. 土方开挖、破碎、外运过程中, 所有手续(包括市容、环卫、渣土办、交通线路等相关政府监管部门手续)均由乙方办理, 其费用亦由乙方自理。

第 1 页 共 33 页

分包项目	单价 (元)	暂定工程量	合价 (元)	工程内容
土石工程	155 元/立方 米	93500 立方 米	14492500	1. 土石方开挖及外运、运至合法卸土点、缴纳必需的消纳处置费、第三方管理服务费、特管费及各项费用。 2. 包括综合考虑处理地下障碍物、开挖、修边、夯实等。 3. 素土回填(包括分层填方碾压)。 4. 土方开挖期间的场地清理。 5. 配合人工挖土的机械台班。 6. 根据实际施工条件,可能会产生的特种挖机台班(如长臂挖机)。 7. 运距及弃土点由承包人自行考虑。 8. 基坑底部消槽的机械设备及外运。 9. 塔吊基础先行开挖。 10. 其他完成土方工程所必须的工作。
暂定合同总价为: ¥1449 万元 (大写: 人民币壹仟肆佰肆拾玖万元)				
1. 以上报价均已含 9% 发票税率。 2. 报价人保证协调工地内外社会关系。 3. 以上报价为综合包干单价, 不随其他任何因素而调高。				

备注:

在土方施工时, 如果场地具备条件, 应该考虑在场地内预留部分土方, 不必要全部外运, 增加成本。

(一) 合同暂定总价: 合价 1449 万元。最终结算总价按照乙方完成并验收合格的实际工程量计算。

(二) 对合同单价的说明:

1. 本合同单价均包括机械进出场、场地内短驳运输、外运及保险、弃土及一切其他必要费用。

2. 为避免机械挖土损伤桩基, 乙方应严格按照甲方指定的机械挖土、人工挖土界面进行施工。桩顶标高以上 30 公分必须采用人工挖土。按规范须采用人工挖土而乙方擅自采用机械挖土的, 甲方有绝对权力制止。采用人工挖土之价格

乙方承担)，否则引起的一切后果由乙方自行承担。

(七) 往来文件：双方在本分包工程实施过程中的往来文件，经指定的资料员签收视为送达对方。

(八) 乙方确认，在合同履行过程中，无论如何，乙方不会越过甲方向建设单位追索任何费用或责任，以免影响建设单位与甲方的合作关系。

(九) 本合同自甲方、乙方双方签字之日起生效，双方履行完成合同义务后终止。若合同在执行过程中因故终止，不影响合同中结算及清理条款的效力。

(十) 有争议时，双方应首先通过协商或者调解解决。如协商或调解不成，则将争议提交工程所在地的人民法院判决。

(十一) 组成合同的文件

1. 本分包工程施工合同。
2. 甲方公司的各项管理制度。
3. 乙方提出、并经建设单位、甲方批准的施工进度计划。
4. 双方签订的各种补充协议。

甲方与建设单位签署的《建设工程施工合同》中，甲方作出的承诺，对乙方亦具有约束力。

(十二) 合同正本两份，具有同等法律效力，由双方签字、盖章后各执一份。副本两份，签约双方各执一份。

以上合同条款乃是双方真实意思表示，不存在欺诈、胁迫、乘人之危、显失公平或其他可能导致合同无效之情形，兹签署予以确认。

甲方：上海奉贤二建股份有限公司

乙方：上海汪太市政工程有限公司

法定代表人或其委托人

法定代表人或其委托人

签署日期：2024年04月09日

第 19 页 共 33 页

七、企业信用状况

信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用中国

请输入企业名称或统一社会信用代码

搜索

信用信息

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

上海三木控股集团有限公司

查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

12:07:08

2026年8月28日 七月十六

2026年8月

一	二	三	四	五	六	日
27 +四	28 +五	29 +六	30 +七	31 +八	1 +九	2 +十
3 +一	4 +二	5 +三	6 +四	7 +五	8 +六	9 +七
10 +八	11 +九	12 +十	13 +一	14 +二	15 +三	16 +四
17 +五	18 +六	19 +七	20 +八	21 +九	22 +十	23 +一
24 +二	25 +三	26 +四	27 +五	28 +六	29 +七	30 +八
31 +九	1 +十	2 +一	3 +二	4 +三	5 +四	6 +五

日期和时间设置



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用查询



搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

上海三木建筑工程有限公司

查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

12:08:49

2026年03月28日 七月十六

2026年03月						
一	二	三	四	五	六	日
27 廿九	28 三十	29 初一	30 初二	31 初三	1 初四	2 初五
3 初六	4 初七	5 初八	6 初九	7 初十	8 十一	9 十二
10 十三	11 十四	12 十五	13 十六	14 十七	15 十八	16 十九
17 二十	18 廿一	19 廿二	20 廿三	21 廿四	22 廿五	23 廿六
24 廿七	25 廿八	26 廿九	27 三十	28 初一	29 初二	30 初三
31 初四	1 初五	2 初六	3 初七	4 初八	5 初九	6 初十

日期和时间设置

财政部唯一指定政府采购信息公开网站 国家政府采购专业网站

网站服务热线：400-810-996 | 网站服务热线：010-63619289



中国政府采购网
www.ccgp.gov.cn

首页

政策法规

购买服务

监督检查

信息公开

国际专栏



当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录

http://www.ccgp.gov.cn

企业名称：上海王杨建设工程有限公司

统一社会信用代码（或组织机构代码）： 请输入统一社会信用代码（或组织机构代码）

执法单位： 请输入执法单位

重置

删除

查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码（或组织机构代码）	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处理结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
----	------	-------------------	------	---------------	------	------	------	------	------

查询结果： 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录

查询内容：

企业名称：上海王杨建设工程有限公司

查询时间：2026年08月28日 12:10:37

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布，如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部

12:10:37

2026年8月28日 七月十六

2026年8月	一	二	三	四	五	六	日
27 十四	28 十五	29 十六	30 十七	31 十八	1 十九	2 二十	
3 廿一	4 廿二	5 廿三	6 廿四	7 廿五	8 廿六	9 廿七	
10 廿八	11 廿九	12 三十	13 七月	14 初二	15 初三	16 初四	
17 初五	18 初六	19 初七	20 初八	21 初九	22 初十	23 十一	
24 十二	25 十三	26 十四	27 十五	28 十六	29 十七	30 十八	
31 十九	1 二十	2 廿一	3 廿二	4 廿三	5 廿四	6 廿五	

日期时间设置

日期和时间设置

1、信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果截图页面;

2、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果截图页面;

注:

1、请完整提供符合招标文件要求的相关查询记录;

2、所有查询记录时间节点应为自采购公告发布之日起至磋商响应文件递交截止日内任意时间;

3、根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》(财库【2022】3号),“《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的,从其规定。”此意见自 2022 年 2 月 8 日起施行。此前颁布的有关规定与本意见不一致的,按照本意见执行。请投标人注意识别。



八、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方 上海汪太市政工程有限公司 (投标人名称) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(四)项规定条件, 具体包括:

1. 具有健全的财务会计制度;
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标人名称 (公章): 上海汪太市政工程有限公司

日期: 2026.9.1

资产负债表

纳税人名称：上海汪太市政工程有限公司

会小企01表

所属期：2026-01-01至2026-06-30

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	50,118,188.73	61,655,585.30	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3	4,695,897.86		应付账款	33	66,341,714.10	47,236,586.52
应收账款	4	35,149,892.63	18,348,158.37	预收账款	34		
预付账款	5	12,121,993.65		应付职工薪酬	35	371,214.25	
应收股利	6			应交税费	36	-162,040.26	
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	537,618.09	362,294.61	应付利润	38		
存货	9	472,993.03		其他应付款	39	11,908,083.70	15,168,634.02
其中：原材料	10			其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计	41	78,458,971.79	62,405,220.54
库存商品	12			非流动负债：			
周转材料	13			长期借款	42		
其他流动资产	14			长期应付款	43		
流动资产合计	15	103,096,583.99	80,366,038.28	递延收益	44		
非流动资产：				其他非流动负债	45		
长期债券投资	16			非流动负债合计	46	0.00	0.00
长期股权投资	17			负债合计	47	78,458,971.79	62,405,220.54
固定资产原价	18	36,801,906.37	36,121,039.09				
减：累计折旧	19	23,706,782.16	21,098,422.55				
固定资产账面价值	20	13,095,124.21	15,022,616.54				
在建工程	21						
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	8,732,732.41	5,802,350.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50	3,225,489.87	3,016,462.21
其他非流动资产	28			未分配利润	51	26,254,899.51	24,164,622.07
非流动资产合计	29	13,095,124.21	15,022,616.54	所有者权益（或股东权	52	32,732,732.41	32,983,434.28
资产总计	30	116,191,708.20	95,388,654.82	负债和所有者权益（或	53	116,191,708.20	95,388,654.82

利润表

纳税人名称：上海汪太市政工程有限公司

会小企02表

2026年6月

单位：元

项 目	行次	本月(季)数	本年累计数
一、营业收入	1	919,622.39	47,495,189.54
减：营业成本	2	826,740.53	43,671,825.40
营业税金及附加	3		30,280.58
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市建设维护税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11	128,382.97	211,205.48
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	268,992.24	1,837,472.27
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17		
财务费用	18	-12,238.19	-158,999.04
其中：利息费用(收入以“-”号填列)	19		-13,347.36
加：投资收益(损失以“-”号填列)	20		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	-292,255.16	1,903,404.85
加：营业外收入	22	360,000.00	633,270.46
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24		1,376.21
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	67,744.84	2,535,299.10
减：所得税费用	31		45,024.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	67,744.84	2,090,274.67

现金流量表

纳税人名称：上海汪太市政工程有限公司

会小企03表

2026年6月

单位：元

项 目	行次	本月(季)数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	754,569.50	49,017,687.35
收到其他与经营活动有关的现金	2	372,321.89	19,702,171.88
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	1,638,981.15	57,164,848.48
支付的职工薪酬	4	319,109.40	3,876,055.83
支付的税费	5		2,935,400.65
支付其他与经营活动有关的现金	6	34,738.59	10,744,135.91
经营活动产生的现金流量净额	7	-865,937.75	-6,000,581.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		31,858.40
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12		7,876.11
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	23,982.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14		
吸收投资者投资收到的现金	15	1,600,000.00	2,450,000.00
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17		10,797.22
分配利润支付的现金	18		8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	1,600,000.00	-5,560,797.22
四、现金净增加额	20	-1,135,937.75	-1,537,396.57
加：期初现金余额	21	48,884,126.48	61,655,585.30
五、期末现金余额	22	50,118,188.73	50,118,188.73

单位参加城镇社会保险基本情况

2026 年 07 月

参保名称：上海汪太市政工程有限公司

社会保险码：01188040

参加社会保险登记年月	2018年09月	
参保所在地	奉贤	
联系地址	上海市奉贤区奉城镇神州路580号	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	沙立利	
统一社会信用代码	91310120MA1HPEWA42	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2026 年 06 月缴费状态	正常缴费	
截至 2026 年 06 月单位参保人数信息	账户人数	24 人
	缴费人数	24 人
	领取养老待遇人数	0 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 07 月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称: 上海汪太市政工程有限公司

社会保险码: 01188040

序号	姓名	证件号码	上月缴费状态
63	沙立利	341522199606266977	参保缴费
112	刘好太	342422196509031756	参保缴费
113	陈茂友	342421197412211214	参保缴费
120	桑双双	342423199601016807	参保缴费
130	姚尚芳	342423197204266969	参保缴费
132	胡元婷	500112198802124829	参保缴费
137	徐秀娟	22028319850716192X	参保缴费
139	丁刚	310103197907290034	参保缴费
142	傅士扬	320827197705161278	参保缴费
143	陈红	420122197209050011	参保缴费
179	徐宾	342222198708200194	参保缴费
183	姚传贺	342423198810226814	参保缴费
192	游林华	411627199205216923	参保缴费
193	袁绪娥	342422198108210509	参保缴费
195	夏克路	342422198910121175	参保缴费
212	李丰友	320911197203030635	参保缴费
215	惠路新	342225199207181566	参保缴费
223	袁莫凡	31022619930705001X	参保缴费
226	曾正浩	320911198604152515	参保缴费
227	卢兴贵	330727197604212212	参保缴费
228	陈小兵	510921198501151614	参保缴费
230	胡威	321322198903182017	参保缴费
231	纪明春	230505198202050224	参保缴费
232	周杰	310226198902215515	参保缴费

第 1 页

上海市社会保险事业管理中心
打印日期: 2026 年 07 月 02 日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称: 上海汪太市政工程有限公司

社会保险码:01188040

第 2 页

上海市社会事业管理中心

打印日期: 2026 年 07 月 02 日

第 2 页

上海市社会保险事业

打印日期: 2026 年

业务专用

姓名	身份证号	姓名	身份证号
张明	310101199001010001	李强	310102198505050002
王小红	310103199203030003	赵伟	310104198807070004
陈伟	310105199509090005	孙丽	310106199101010006
周小华	310107199307070007	吴昊	310108198903030008
郑宇	310109199601010009	徐静	310110199405050010
黄磊	310111199709090011	林娜	310112199001010012
刘洋	310113199803030013	王磊	310114199907070014
李娜	310115199605050015	张强	310116199709090016
陈伟	310117199401010017	孙丽	310118199503030018
周小华	310119199607070019	吴昊	310120199801010020
郑宇	310121199905050021	徐静	310122199709090022
黄磊	310123199801010023	林娜	310124199903030024
刘洋	310125199607070025	王磊	310126199701010026
李娜	310127199805050027	张强	310128199909090028
陈伟	310129199703030029	孙丽	310130199807070030
周小华	310131199901010031	吴昊	310132199605050032
郑宇	310133199709090033	徐静	310134199801010034
黄磊	310135199903030035	林娜	310136199707070036
刘洋	310137199805050037	王磊	310138199909090038
李娜	310139199601010039	张强	310140199703030040
陈伟	310141199807070041	孙丽	310142199901010042
周小华	310143199705050043	吴昊	310144199809090044
郑宇	310145199903030045	徐静	310146199707070046
黄磊	310147199801010047	林娜	310148199905050048
刘洋	310149199607070049	王磊	310150199701010050
李娜	310151199809090051	张强	310152199903030052
陈伟	310153199705050053	孙丽	310154199807070054
周小华	310155199901010055	吴昊	310156199709090056
郑宇	310157199803030057	徐静	310158199905050058
黄磊	310159199601010059	林娜	310160199707070060
刘洋	310161199809090061	王磊	310162199901010062
李娜	310163199703030063	张强	310164199803030064
陈伟	310165199907070065	孙丽	310166199705050066
周小华	310167199801010067	吴昊	310168199909090068
郑宇	310169199605050069	徐静	310170199701010070
黄磊	310171199803030071	林娜	310172199907070072
刘洋	310173199709090073	王磊	310174199801010074
李娜	310175199905050075	张强	310176199703030076
陈伟	310177199807070077	孙丽	310178199905050078
周小华	310179199601010079	吴昊	310180199707070080
郑宇	310181199809090081	徐静	310182199901010082
黄磊	310183199703030083	林娜	310184199803030084
刘洋	310185199907070085	王磊	310186199705050086
李娜	310187199801010087	张强	310188199909090088
陈伟	310189199605050089	孙丽	310190199701010090
周小华	310191199803030091	吴昊	310192199907070092
郑宇	310193199709090093	徐静	310194199801010094
黄磊	310195199905050095	林娜	310196199703030096
刘洋	310197199807070097	王磊	310198199905050098
李娜	310199199601010099	张强	310200199707070100

单位参加城镇社会保险基本情况

2026 年 08 月

参保名称：上海汪太市政工程有限公司

社会保险码：01188040

参加社会保险登记年月	2018年09月	
参保所在地	奉贤	
联系地址	上海市奉贤区奉城镇神州路580号	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	沙立利	
统一社会信用代码	91310120MA1HPWEA42	
截至 2026 年 07 月缴费状态	正常缴费	
截至 2026 年 07 月单位参保人数信息	账户人数	24 人
	缴费人数	24 人
	领取养老待遇人数	0 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 08 月 05 日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海汪太市政工程有限公司

社会保险码：01188040

序号	姓名	证件号码	上月缴费状态
63	沙立利	341522199606266977	参保缴费
112	刘好太	342422196509031756	参保缴费
113	陈茂友	342421197412211214	参保缴费
120	桑双双	342423199601016807	参保缴费
130	姚尚芳	342423197204266969	参保缴费
132	胡元婷	500112198802124829	参保缴费
137	徐秀娟	22028319850716192X	参保缴费
139	丁刚	310103197907290034	参保缴费
142	傅士扬	320827197705161278	参保缴费
143	陈红	420122197209050011	参保缴费
179	徐宾	342222198708200194	参保缴费
183	姚传贺	342423198810226814	参保缴费
192	游林华	411627199205216923	参保缴费
193	袁绪娥	342422198108210509	参保缴费
195	夏克路	342422198910121175	参保缴费
212	李丰友	320911197203030635	参保缴费
215	惠路新	342225199207181566	参保缴费
223	袁莫凡	31022619930705001X	参保缴费
226	曾正浩	320911198604152515	参保缴费
227	卢兴贵	330727197604212212	参保缴费
228	陈小兵	510921198501151614	参保缴费
230	胡威	321322198903182017	参保缴费
231	纪明春	230505198202050224	参保缴费
232	周杰	310226198902215515	参保缴费



第 1 页

上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2026 年 08 月 05 日

社会保险码:01188040

上海市社会事业管理中心

打印日期: 2026 年 08 月 05 日

第 2 页		上海市社会保险事业管理中心 打印日期: 2026 年 08 月 05 日 
姓名: 张三 性别: 男 出生日期: 1980-01-01 身份证号: 310101198001010001 联系电话: 13800138000 电子邮箱: zhangsan@example.com 联系地址: 上海市浦东新区张江路100号	姓名: 李四 性别: 女 出生日期: 1985-05-15 身份证号: 310102198505150002 联系电话: 13900139000 电子邮箱: lisi@example.com 联系地址: 上海市静安区南京西路100号	姓名: 王五 性别: 男 出生日期: 1990-03-20 身份证号: 310103199003200003 联系电话: 13600136000 电子邮箱: wangwu@example.com 联系地址: 上海市徐汇区淮海中路100号
姓名: 赵六 性别: 女 出生日期: 1992-07-08 身份证号: 310104199207080004 联系电话: 13500135000 电子邮箱: zhaoliu@example.com 联系地址: 上海市杨浦区五角场100号	姓名: 孙七 性别: 男 出生日期: 1988-09-12 身份证号: 310105198809120005 联系电话: 13700137000 电子邮箱: sunqi@example.com 联系地址: 上海市虹口区四川北路100号	姓名: 周八 性别: 女 出生日期: 1995-11-03 身份证号: 310106199511030006 联系电话: 13200132000 电子邮箱: zhouba@example.com 联系地址: 上海市普陀区长寿路100号
姓名: 吴九 性别: 男 出生日期: 1982-02-25 身份证号: 310107198202250007 联系电话: 13100131000 电子邮箱: wujiu@example.com 联系地址: 上海市黄浦区南京东路100号	姓名: 郑十 性别: 女 出生日期: 1987-06-18 身份证号: 310108198706180008 联系电话: 13000130000 电子邮箱: zhengshi@example.com 联系地址: 上海市浦东新区世纪大道100号	姓名: 冯十一 性别: 男 出生日期: 1991-04-05 身份证号: 310109199104050009 联系电话: 13400134000 电子邮箱: fengshi@example.com 联系地址: 上海市闵行区金都路100号
姓名: 陈十二 性别: 女 出生日期: 1989-10-10 身份证号: 310110198910100010 联系电话: 13300133000 电子邮箱: chen12@example.com 联系地址: 上海市宝山区淞滨路100号	姓名: 马十三 性别: 男 出生日期: 1986-08-22 身份证号: 310111198608220011 联系电话: 13800138000 电子邮箱: ma13@example.com 联系地址: 上海市嘉定区南翔镇100号	姓名: 朱十四 性别: 女 出生日期: 1993-12-01 身份证号: 310112199312010012 联系电话: 13600136000 电子邮箱: zhu14@example.com 联系地址: 上海市青浦区练塘镇100号
姓名: 徐十五 性别: 男 出生日期: 1984-03-14 身份证号: 310113198403140013 联系电话: 13900139000 电子邮箱: xushen@example.com 联系地址: 上海市金山区枫泾镇100号	姓名: 林十六 性别: 女 出生日期: 1990-09-27 身份证号: 310114199009270014 联系电话: 13700137000 电子邮箱: lin16@example.com 联系地址: 上海市奉贤区南桥镇100号	姓名: 王十七 性别: 男 出生日期: 1987-01-09 身份证号: 310115198701090015 联系电话: 13500135000 电子邮箱: wang17@example.com 联系地址: 上海市崇明区城桥镇100号
姓名: 李十八 性别: 女 出生日期: 1994-05-06 身份证号: 310116199405060016 联系电话: 13200132000 电子邮箱: li18@example.com 联系地址: 上海市浦东新区川沙新镇100号	姓名: 张十九 性别: 男 出生日期: 1988-11-19 身份证号: 310117198811190017 联系电话: 13000130000 电子邮箱: zhang19@example.com 联系地址: 上海市金山区朱泾镇100号	姓名: 赵二十 性别: 女 出生日期: 1991-07-24 身份证号: 310118199107240018 联系电话: 13400134000 电子邮箱: zhao20@example.com 联系地址: 上海市奉贤区南汇镇100号
姓名: 王二十一 性别: 男 出生日期: 1985-04-02 身份证号: 310119198504020019 联系电话: 13800138000 电子邮箱: wang21@example.com 联系地址: 上海市崇明区竖新镇100号	姓名: 李二十二 性别: 女 出生日期: 1992-12-11 身份证号: 310120199212110020 联系电话: 13600136000 电子邮箱: li22@example.com 联系地址: 上海市浦东新区川沙新镇100号	姓名: 张二十三 性别: 男 出生日期: 1989-06-16 身份证号: 310121198906160021 联系电话: 13900139000 电子邮箱: zhang23@example.com 联系地址: 上海市金山区朱泾镇100号
姓名: 赵二十四 性别: 女 出生日期: 1996-02-28 身份证号: 310122199602280022 联系电话: 13700137000 电子邮箱: zhao24@example.com 联系地址: 上海市奉贤区南汇镇100号	姓名: 马二十五 性别: 男 出生日期: 1987-10-07 身份证号: 310123198710070023 联系电话: 13500135000 电子邮箱: ma25@example.com 联系地址: 上海市崇明区竖新镇100号	姓名: 朱二十六 性别: 女 出生日期: 1993-08-13 身份证号: 310124199308130024 联系电话: 13200132000 电子邮箱: zhu26@example.com 联系地址: 上海市浦东新区川沙新镇100号
姓名: 王二十七 性别: 男 出生日期: 1986-01-21 身份证号: 310125198601210025 联系电话: 13000130000 电子邮箱: wang27@example.com 联系地址: 上海市金山区朱泾镇100号	姓名: 李二十八 性别: 女 出生日期: 1994-09-04 身份证号: 310126199409040026 联系电话: 13400134000 电子邮箱: li28@example.com 联系地址: 上海市奉贤区南汇镇100号	姓名: 张二十九 性别: 男 出生日期: 1988-03-17 身份证号: 310127198803170027 联系电话: 13800138000 电子邮箱: zhang29@example.com 联系地址: 上海市崇明区竖新镇100号

九、商务响应表

商务响应表

供应商全称（公章）：上海汪太市政工程有限公司 标项：标项1

项目	磋商文件要求	是否响应	磋商响应方的承诺或说明
投标报价	本项目仅对外运成本费报价，卸点费 15 元 /m³ 固定；综合单价 = 外运成本单价 + 15 元 /m³，包含全部费用，最终按实结算，不超概算	是	我方完全响应报价要求，报价全部为含税价格，包含人工、机械、运输、手续办理、税费、安全防护、协调等全部费用；卸点费 15 元 /m³ 按招标文件要求固定不变；最终结算以监理、建设单位确认实际合格方量结合财政审定价为准，总价款不超过项目概算，无偏离。
投标有效期	90 日历天	是	我方承诺磋商响应文件有效期自磋商截止之日起为 90 日历天，满足招标文件要求，无偏离。
工期	合同签订后服从甲方现场开工指令，总工期 60 日历天	是	我方承诺服从建设单位现场开工指令，总工期严格控制在 60 日历天，无偏离。
法定代表授权委托书	授权代表为本单位在职职工，格式完整，签字盖章齐全	是	我方按招标文件格式提供法定代表人授权委托书，授权代表为本单位在职职工，签字、盖章齐全，并附被授权人身份证复印件，无偏离。
营业执照	合法有效营业执照	是	我方提供合法有效的营业执照复印件并加盖公章，资格条件满足政府采购法第二十二条规定，无偏离。
资质证书	1. 道路运输经营许可证；2. 建设工程垃圾运输许可证；3. 项目负责人建筑工程二级及以上注册建造师	是	我方具备《道路运输经营许可证》《建设工程垃圾运输许可证》；拟派项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，相关证书复印件已附于响应文件内，无偏离。
质量情况	满足本项目土方外运消纳全部质量、土质、文明施工及属地管理要求，工程质量合格，接受各方监督整改	是	我方严格落实土质管控，外运土方满足属地卸点回填标准，严禁建筑垃圾、污染土外运，不合格土方无条件运回处置；卸点按要求分层摊铺平整，做好排水防护；落实扬尘文明施工管控；完全接受建设单位、监理、属地村委监督检查，发现问题限时闭环整改，确保工程质量合格，无偏离。
项目负责人情况	建筑工程二级及以上注册建造师，本单位在职人员	是	拟派本项目项目负责人为我单位在职正式职工，具备建筑工程专业二级及以上注册建造师及安全生产考核合格 B 证，相关证书简历资料详见响应文件技术部分，无偏离。
能力或业绩要求	同类土方外运消纳项目业绩	是	同类土方外运消纳项目业绩材料（合同 / 中标通知书复印件），详见商务文件业绩一览表，无偏离。
联合体投标	不接受联合体投标	是	我方不采用联合体投标，无偏离。

全权代表签名：周木

日期：2026.9.1

十、资质材料

资质证书



建筑业企业资质证书

企业名称: 上海汪太市政工程有限公司

详细地址: 上海市奉贤区奉城镇爱民村223号

统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 91310120MA1HPWEA42

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: D231A89900

资质类别及等级:
建筑工程施工总承包贰级2028年11月13日; 地基基础工程专业承包
贰级2028年11月13日



发证机关:

2024年 05月 31日

中华人民共和国住房和城乡建设部制




全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

43

工程垃圾运输许可证

	
上海市建设工程垃圾运输许可证	
沪 绿容许第 23FX0110 号	
法 人 名 称:	上海汪太市政工程有限公司
统一社会信用代码:	91310120MA1HPEWA42
注册 资 本:	人民币2000.0000万元整
行政许可事项名称:	建设工程垃圾运输许可证的核发
类 别 及 专 业:	工程渣土和拆房垃圾道路运输 (奉贤区陆城)
许可日期:	二〇二三年四月十九日
发证机关 (盖章)	二〇二三年四月十九日
本证书有效期:	二〇二三年四月十九日至 二〇二七年十二月三十一日



中华人民共和国

道路运输经营许可证

沪交运管许可

字

310120012963

号

业户名称:

上海江太市政工程有限公司

地址:

上海市奉贤区奉城镇南
奉公路686号4幢

经营范围:

普通货运

证件有效期:

2023 年 02 月 09 日

至

2023 年 02 月 10 日



中华人民共和国交通运输部监制

企业安全生产许可证



统一社会信用代码: 91310120MA1HPEWA42

编号: (沪) JZ安许证字[2019]191155

安全生产许可证



企业名称	上海汪太市政工程有限公司		
法定代表人	沙立利		
单位地址	上海市奉贤区奉城镇爱民村223号		
经济类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
许可范围	建筑施工		
有效期	2024年12月20日	至	2027年12月19日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年12月19日

奉贤区建筑垃圾运输中标通知书

项目编号	23SRFX0017-Z01
招标方式	公开招标

上海市渣土项目中标通知书

(第二联:中标单位)

上海汪太市政工程有限公司:

我单位奉贤区建筑垃圾(工程渣土和拆房垃圾)运输单位招标项目(2023-2027年度)项目,经评标委员会评审,由你单位等16家单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内,来我单位签订合同。

中标内容	工程渣土和拆房垃圾		
承运区域	上海市奉贤区		
承运期限	2023年1月1日至2027年12月31日		
项目负责人	沙立利	联系电话	18917085678
招标单位:(盖章)	法定代表人:(盖章)		2023年4月10日

附注:本表一式四联:第一联:招标单位

第二联:中标单位

第三联:上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心

第四联:招标代理公司

十一、公司情况介绍

我司成立于 2018 年 7 月，是一家资质体系完备、综合实力雄厚的市政工程全链条服务企业。公司注册于上海市奉贤区奉城镇，注册资本 2000 万元，设奉城、南桥双运营基地——南奉公路神州路场站与金海公路商务办公区遥相呼应，自有办公空间 780 平方米、标准化停车场地 4500 平方米，配套专业车辆冲洗系统、维保工区与配件仓储中心，硬件根基扎实，服务布局清晰。

公司业务涵括市政公用工程施工、土石方工程、建筑装饰装修一体化、公路桥隧工程、地基基础工程、河湖整治、园林绿化、道路货物运输、水电安装、物业管理等多元领域，形成“工程施工+渣土运输+运维保障”协同发展的业务格局。现持有建筑工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包二级资质，拥建筑垃圾运输许可、道路运输经营许可、安全生产许可等全套运营资质，为上海市市容环境卫生行业协会会员单位。公司以安全为发展之基，笃行合规之道，自 2018 年起连续五年获评“交通安全先进集体”，2021 年度“安全守法奖”，累累荣誉印证企业责任底色。

工欲善其事，必先利其器。公司自有经交管、废管、运管多部门联合核验合格的土方自卸运输车 70 余台，配属道路冲洗车、挖掘机、巡查车、应急抢修车等各类工程装备数十台，机械阵容齐整，作业保障充沛。人才梯队方面，现有员工 110 余名，结构完善、术业专精：72 名持证驾驶员均具 3 年以上渣土运输从业经验；汇聚总工程师、二级建造师、专职安全员、现场管理员等专业技术管理人才数十名，辅以维保、后勤、行政保障团队，全员劳动合同签订率达 100%，用工规范严谨，队伍稳定善战。

自成立以来，公司秉持“匠造精品、履约致远”的理念，深耕奉贤本土建设主战场，先后承建一批重点民生工程与产业载体，助力区域城市更新与民生改善。2022 年，奉贤新城 1728 商务地块、江海村农民安置房、奉贤医疗产业园项目；2023 年，西渡街道、奉城镇动迁安置房项目稳步推进；2024 年，智汇未来产业园、泰日社区、庄行镇征收安置房项目如期交付；2025 年，奉贤新城多单元重点地块工程接续启动。数载耕耘，多项工程获建设单位书面褒扬，在奉贤市政领域树立起品质可靠的口碑。

治企有章法，管控见精微。公司构建权责明晰的组织架构，设决策管理层与财务、安全综合办公、GPS 监控中心、调度室等职能部门，组建专项应急处置队伍，形成全流程闭环管理体系。运营端以智慧化赋能安全管控，依托车载 GPS 动态监管平台，健全从业人员安全台账与应急处置预案，严格执行密闭运输、限速 60 公里、右转必停等作业规范；现场端配备专职管理团队驻场督

导，严管车辆“洒、冒、滴、漏”，出场车辆全流程冲洗保洁，将文明施工、绿色运输理念贯穿作业全周期。

公司坚持以人为本，打造整洁舒适的员工宿舍与职工食堂，配套阅览室、健身房、驾驶员休息室等文娱空间，常态化组织文体活动，于细微处暖人心、聚合力，让员工安身立业，团队凝聚力与战斗力持续提升。风好正扬帆，笃行向未来。汪太市政的成长与发展，始终离不开奉贤区委、区政府及各级行业主管部门的悉心指导与鼎力支持。面向新征程，公司将始终恪守“以质量求生存、以信誉求发展”的初心，以规范化管理为纲，以环保安全为要，以匠心品质为本，深耕奉贤热土，服务城市建设，持续精进管理效能，锤炼核心竞争力，与奉贤城市发展同频共振，为区域城市更新与环境品质提升贡献坚实力量。



十二、节能环保等的资质证书或文件

NOA

环境管理体系认证证书

兹证明

上海汪太市政工程有限公司

注册地址: 上海市奉贤区奉城镇爱民村 223 号

其环境管理体系已通过 NOA Certification 的评审, 符合

GB/T 24001-2016 / ISO14001:2015 标准

《环境管理体系 要求及使用指南》

审核地址: 上海市奉贤区金海公路 3265 号 20 号楼 2 单元 13 楼

认证范围: 资质范围内普通货物运输服务

审核地址: 上海市奉贤区神州路 580 号

功能/活动: 停车场服务

(代码: 31)

认证证书编号: NOA2501136

统一社会信用代码: 91310120MA1HPEWA42

首次注册日期: 2025 年 02 月 19 日

监督审核通过标签:

NOA

第二次监督审核贴标处

第三次监督审核贴标处

认证经理

NOA

ISO 14001

MANAGEMENT

CERTIFICATION

MEMBER OF MULTILATERAL

IAF

RECOGNITION ARRANGEMENT

IAS

ACCREDITED

Management Systems

Certification Body

MSCB-261

微信扫码上方二维码, 验证证书有效性。

证书签发日期: 2026.03.06

注册截止日期: 2028.02.18

本证书由挪亚检测认证集团有限公司提供。获证组织应按照认证认可规则和认证合同规定执行监督审核, 并加贴监督审核通过标签, 以保持证书有效性。认证证书是否有效, 请登录本机构网站(www.noagroup.com) 查询, 或微信扫描上方二维码。证书范围如涉及行政许可、资质及强制性产品认证的, 本证书仅覆盖行政许可、资质及强制性产品认证有效期内的产品和活动。

挪亚检测认证集团有限公司

地址: 中国·上海市闵行区联川路169号5幢二层 邮箱地址: info@noagroup.com



质量管理体系认证证书

兹证明

上海汪太市政工程有限公司

注册地址: 上海市奉贤区奉城镇爱民村 223 号

其质量管理体系已通过 NOA Certification Service 的评审, 符合

GB/T 19001-2016 / ISO9001:2015 标准
《质量管理体系 要求》

审核地址: 上海市奉贤区金海公路 3265 号 20 号楼 2 单元 13 楼

认证范围: 资质范围内普通货物运输服务

审核地址: 上海市奉贤区神州路 580 号

功能/活动: 停车场服务

(代码: 31)

认证证书编号: NOA2501135

统一社会信用代码: 91310120MA1HPEWA42

首次注册日期: 2025 年 02 月 19 日

监督审核通过标签:



第二次监督
贴标处

第三次监督
贴标处



MSCB-261

认证经理



微信扫描上方二维码,
验证证书有效性。

证书签发日期: 2026.03.06

注册截止日期: 2028.02.18

本证书由挪亚检测认证集团有限公司提供。获证组织应按照认证认可规则和认证合同规定执行监督审核, 并加贴监督审核通过标签, 以保持证书有效性。认证证书是否有效, 请登录本机构网站 (www.noagroup.com) 查询, 或微信扫描上方二维码。证书范围如涉及行政许可、资质及强制性产品认证的, 本证书仅覆盖行政许可、资质及强制性产品认证有效期内的产品和活动。

挪亚检测认证集团有限公司

地址: 中国·上海市闵行区联川路169号5幢二层 邮箱地址: info@noagroup.com

十三、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司（联合体）参加上海汪太市政工程有限公司（单位名称）的青村镇体育公园土方外运消纳工程 项目编号：310120111260722125218-20370924（标项 1）（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、青村镇体育公园土方外运消纳工程 项目编号：310120111260722125218-20370924（标项 1），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为上海汪太市政工程有限公司，从业人员75人，营业收入为10000万元，资产总额为6500万元，属于中型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：上海汪太市政工程有限公司

日期：2026.9.1

注：

- 1、本项目所属行业为其他未列明行业；
- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
- 3、中小企业划型标准应按照工信部联企业（2011）300号内相关规定；

4、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交结果将公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》；

5、若响应人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

中小微企业划型标准如下：

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$

物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

十四、残疾人福利企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____/_____单位的_____/_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：上海汪太市政工程有限公司

日期：2026.9.1



十五、磋商响应方控股情况

磋商响应方控股情况

致 上海市奉贤区青村镇城市建设管理事务中心（采购人）：


1. 与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：无
2. 我方的控股股东如下：上海汪太市政工程有限公司、股东：沙立利、控股：100%
3. 我方直接控股的企业如下：上海汪太市政工程有限公司
4. 与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：无


单位名称（盖章）：上海汪太市政工程有限公司

日期：2026.9.1



十六、其他文件资料

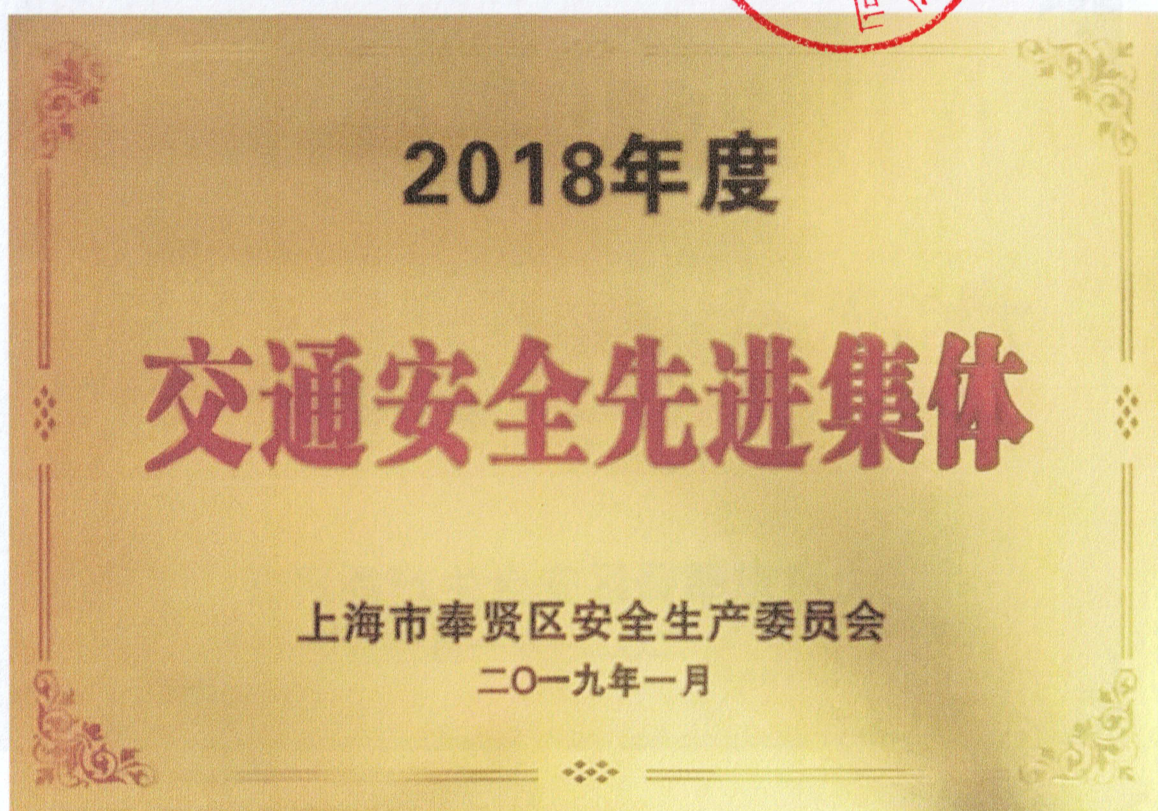

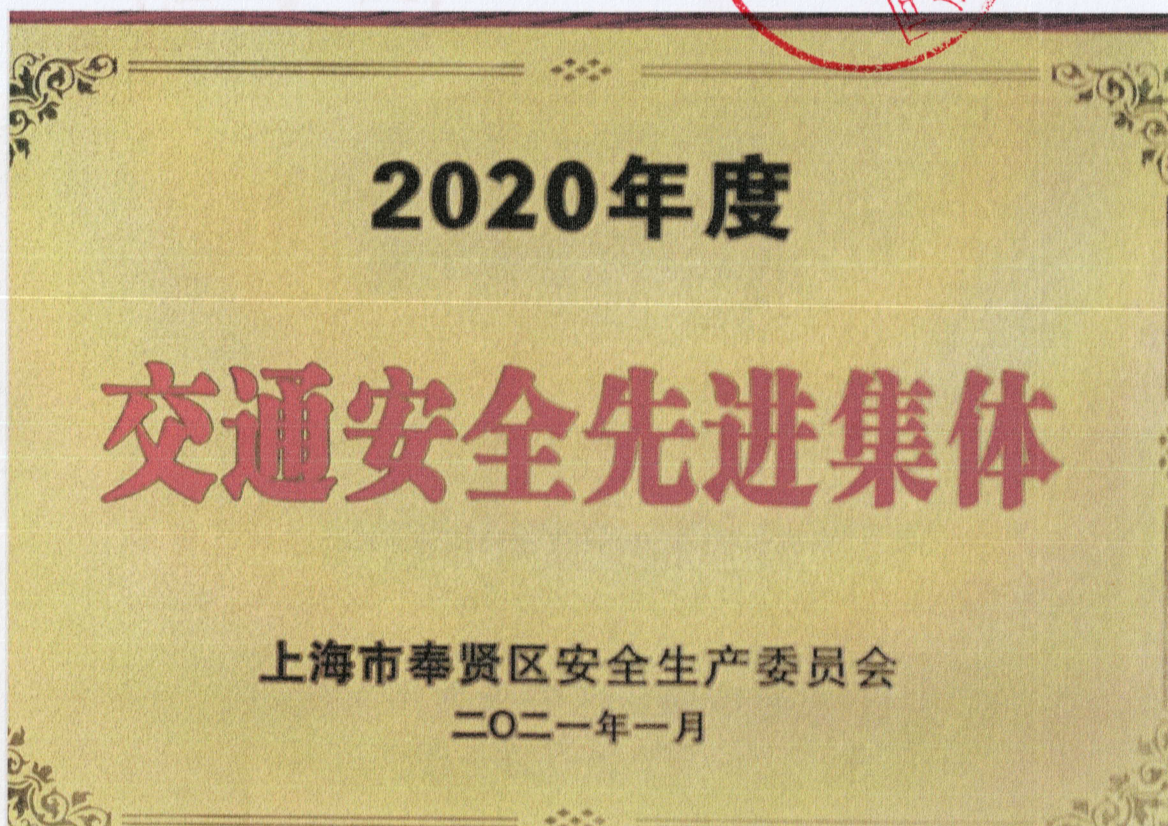

2021年度

交通安全先进集体

上海市奉贤区安全生产委员会

二〇二二年一月



2022年度

交通安全先进集体

上海市奉贤区安全生产委员会

二〇二三年一月


荣誉证书

上海汪太市政工程有限公司

在以“聚焦短板求突破，同台竞技谱新篇”为主题的2021年度工程渣土行业劳动竞赛中，表现优异，
荣获 **安全守法奖**。

特发此证，以资鼓励。

上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心
二〇二二年一月二十六日



二〇一七年度

优秀专业分包合作伙伴

兖矿东华建设有限公司上海分公司
二〇一八年二月

正本

青村镇体育公园土方外运消纳工程

项目编号：310120111260722125218-20370924（标项 1）

技 术 文 件



响应方全称：上海汪太市政工程有限公司

地 址：上海市奉贤区奉城镇爱民村 223 号

时 间：2026 年 9 月 1 日

目 录

一、项目的技术服务类总体要求的理解	2
二、项目总体架构及技术操作方案	3
三、设备配置清单	7
四、技术响应表	9
五、施工组织方案及人员安排	10
六、项目负责人简历表	11
七、项目人员配置相关资料	14
八、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施	21
九、其他文件和说明	29

一、项目的技术服务类总体要求的理解

我方已全面、深度研读本项目招标文件、测绘报告、技术要求及相关法律法规，充分理解本项目的核心需求、实施范围、技术标准及合规要求，对项目的重难点进行了全面分析，具体如下：

1. 项目核心概况

本项目为青村镇体育公园土方外运消纳工程，需清运土方总量约 30000 立方米，需将土方运至指定属地村回填卸点，并按要求完成卸点摊铺、平整等工作，服务期限为合同签订之日起 60 个自然日内完成全部工作内容。

2. 项目核心需求

(1) **合规性需求：**本项目为上海市政府采购项目，需严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《上海市建筑垃圾处理管理规定》等相关法律法规，投标人必须具备奉贤区渣土运输合规资质，全流程办理渣土处置相关手续，确保运输、倾倒、处置全流程合规，无路政、环保、城管等部门的违规处罚。

(2) **工期需求：**需在 60 个自然日内完成 30000 立方米土方的开挖、装车、运输、卸点平整全流程工作，需制定科学的进度计划，合理配置人员、设备，确保按期完工，不得延误。

(3) **质量与安全需求：**需严格按照测绘报告及招标人要求完成场地清理、土方开挖、场地平整，地块最终平整标高符合招标人要求，地表无杂物、无植被、无遗留土方；全过程落实安全生产责任制，杜绝人员伤亡、车辆交通事故、设备损坏等安全事故。

(4) **环保与文明施工需求：**需严格落实上海市扬尘污染防治、噪声污染防治相关规定，做好运输车辆密闭、冲洗、保洁，施工现场及运输路线扬尘管控，杜绝“滴、撒、漏”现象，确保文明施工符合临港新片区及行业主管部门要求。

3. 项目重难点分析及应对思路

(1) 重难点一：全流程合规运营管控

应对思路：我方为奉贤区 2023-2027 年度建设工程垃圾作业服务中标单位，具备上海市建设工程垃圾运输许可证，拥有成熟的渣土运输合规管理体系，提前对接行业主管部门完成渣土处置相关手续办理，所有运输车辆均具备合规运营资质，安装符合要求的车载计量设备和行车记录仪，驾驶员全部持证上岗，全流程 GPS 监控，确保运输路线、卸点倾倒完全符合主管部门及招标人要求，杜绝违规运营。

(2) 重难点二：安全文明施工与环保管控

应对思路：建立专职安全管理团队，制定专项安全生产、文明施工、扬尘管控方案，施工现场设置标准化洗车台、沉淀池、围挡、喷淋降尘设备，运输车辆全程密闭，出场前全面冲洗，运输路线避开居民区及敏感路段，合理安排作业时间，杜绝夜间违规施工，洒水降尘全程跟进，确保零环保投诉、零安全事故。

二、项目总体架构及技术操作方案

本项目土方清运全流程分为：前期筹备阶段、现场清理及场地平整阶段、土方开挖装车阶段、土方运输及卸点平整阶段、验收收尾阶段五大阶段，具体操作方案如下：

(一) 前期筹备阶段（合同签订后 1-5 日历天）

本阶段核心目标是完成全部开工前准备工作，确保具备全面开工条件，具体工作内容：

(1) **成立专项项目管理团队：**明确项目负责人、技术负责人、安全员、质量员、现场调度、驾驶员等各岗位职责，完成全员技术交底、安全培训、合规培训，考核合格后方可上岗。

(2) **手续办理：**提前对接上海市及奉贤区渣土管理部门、路政部门、交警部门，完成本项目渣土处置证、运输路线备案等全部相关手续，确保合法合规开工。

(3) **现场勘察与方案细化：**组织项目团队、技术人员对施工地块、运输路线、指定卸点进行全面现场勘察，核对地块边界、土方量、地下管线情况，优化施工路线、开挖顺序、运输方案，编制专项施工组织设计，报招标人审批后执行。

(4) **设备与人员进场筹备：**完成本项目投入的挖掘机、运输车辆、洒水车、洗车设备、围挡等全部设备的检修、保养、校验，确保设备性能完好；落实作业人员住宿、办公场地，完成人员保险购买，确保人员全部到位。

(5) **现场临建设施搭建：**在地块出入口位置搭建标准化洗车台、三级沉淀池、车辆冲洗设备，沿地块边界设置连续封闭围挡，安装喷淋降尘系统、视频监控设备，设置安全警示标识、施工公示牌，完成临水临电接入，全部临建设施符合上海市文明施工标准。

(6) **与招标人对接：**完成与招标人的现场交底，明确现场管理人员、对接人、验收标准、进度汇报机制，提交开工申请，经招标人同意后正式开工。

（二）现场清理及场地平整阶段（合同签订后 3-7 日历天，与前期筹备交叉作业）

本阶段核心目标是完成地块全域地表清理，为土方开挖作业创造条件，具体工作内容：

（1）**地表清理**：组织人工配合机械，对地块内的杂草、树木、生活垃圾、建筑垃圾、杂物等进行全面清理，分类归集后合规清运处置，确保地块内无影响土方开挖的障碍物。

（2）**表层处理**：对地块表层腐殖土、软土进行清理，按招标人要求进行归集或清运，对地块内的坑洼、积水区域进行回填、平整、压实，确保施工场地平整，满足机械作业、车辆通行要求。

（3）**施工便道修筑**：在地块内修筑临时施工便道，采用压实、铺设钢板，确保运输车辆通行顺畅，无泥泞、陷车风险，便道两侧设置排水沟，确保雨天排水通畅。

（4）**地下管线保护**：根据招标人提供的地下管线资料，对地块内的管线位置进行人工探挖，设置明显的保护标识，制定专项保护方案，严禁机械破坏地下管线及构筑物。

（三）土方开挖装车阶段（合同签订后 5-50 日历天，与运输阶段同步作业）

本阶段核心目标是按计划完成 30000 立方米土方的开挖、装车作业，确保开挖质量、作业效率及施工安全，具体工作内容：

（1）**开挖顺序规划**：根据地块标高及平场要求，分区域、分台阶开挖，避免无序开挖造成边坡坍塌、场地积水，开挖过程中严格控制开挖标高，严禁超挖、欠挖。

（2）**机械作业配置**：投入 4 台 200 型挖掘机（备用 1 台），配备专业挖掘机驾驶员，每台挖掘机配置 2 名装车辅助工，负责清理斗内余土、指挥车辆、场地清理，确保装车效率，每车装载量符合核定载重标准，严禁超载。

（3）**装车作业规范**：土方装车采用分层装载，确保车辆装载均匀，不偏载，车厢顶部平整，装载完成后对车厢密闭装置进行全面检查，确保完全密闭，杜绝运输过程中“滴、撒、漏”。

（4）**质量管控**：安排专职质量员全程旁站，对开挖标高、开挖范围进行实时测量复核，确保开挖后地块标高符合招标人要求，每日形成测量记录，报招标人备案。

（5）**安全管控**：专职安全员全程现场值守，划定危险作业区域，设置警示标识，严禁非作业人员进入施工区域，机械作业半径内严禁站人，每日开工前对机械设备进行安全检查，严禁设备带病作业。

（四）土方运输及卸点平整阶段（合同签订后 5-52 日历天，与开挖装车阶段同步作业）

本阶段核心目标是安全、合规、高效完成土方运输及卸点倾倒、平整工作，具体工作内容：

（1）**运输车辆配置：**投入 50 台合规密闭式渣土运输车辆（备用 3 台），所有车辆均具备上海市建设工程垃圾运输资质，安装 GPS 定位系统、车载计量设备、行车记录仪、倒车影像及雷达，车辆密闭装置完好，符合上海市渣土运输车辆标准。

（2）**运输路线规划：**严格按照备案的运输路线行驶，路线为：施工地块出入口→指定卸点，避开居民区、学校、医院等敏感区域，提前排查路线内的限高、限宽、道路施工情况，制定备用路线，确保运输通畅。

（3）运输作业规范：

① 车辆出场前，必须经过洗车台全面冲洗，车轮、车身、底盘无带泥，冲洗废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，严禁污水外排；

② 运输过程中，驾驶员严格遵守交通法规，严禁超速、闯红灯、逆行、超载，全程密闭运输，严禁沿途撒漏；

③ 建立车辆运输台账，每车登记出场时间、运输方量、卸点签收时间，实现运输全流程可追溯；

④ 现场设置专职调度员，通过 GPS 系统实时监控车辆运输状态，合理调配车辆，避免施工现场及卸点车辆拥堵，提高运输效率。

（4）卸点作业规范：

① 车辆到达指定卸点后，严格按照招标人及卸点管理要求，在指定区域倾倒土方，严禁随意倾倒，如发现不合格土方，无条件运回处置；

② 倾倒完成后，投入 2 台推土机、1 台压路机，对倾倒的土方进行分层推平、压实，平整标高符合招标人要求，确保卸点场地平整，无堆积、无坑洼；

③ 安排专职人员在卸点现场指挥，协调车辆倾倒顺序，做好卸点场地保洁、洒水降尘工作，确保卸点作业符合环保及管理要求。

（五）验收收尾阶段（合同签订后 53-60 日历天）

本阶段核心目标是完成项目全部收尾工作，通过招标人竣工验收，具体工作内容：

（1）**地块收尾平整：**土方清运完成后，对施工地块进行全域精细化平整，清理现场遗留的杂物、土方，复核地块标高、平整度，确保完全符合招标人要求及验收标准。

（2）**现场清理：**拆除施工现场的临建设施、围挡、洗车设备等，对施工现场进行全面清理、保洁，恢复场地原貌，做到“工完、料尽、场地清”。

(3) **资料整理归档：**整理项目全过程的施工资料、测量记录、运输台账、手续文件、影像资料等，按招标人及档案管理要求装订成册，形成完整的竣工资料，提交招标人审核。

(4) **竣工验收申请：**向招标人提交竣工验收申请，配合招标人完成现场验收、资料验收，对验收提出的整改意见，立即组织整改，整改完成后复验，直至验收合格，双方签署竣工验收报告。

(六) 工进度计划

本项目总工期 60 个自然日，制定详细的分阶段进度计划，预留 5 天缓冲工期，确保按期完工，具体进度安排如下：

阶段	工作内容	计划工期	备注
第一阶段	前期筹备、手续办理、临建设施搭建、现场勘察与技术交底	第 1-5 日历天	与地表清理交叉作业，提前完成开工手续
第二阶段	地块全域地表清理、表层处理、施工便道修筑、地下管线保护	第 3-7 日历天	完成后具备全面开挖条件
第三阶段	土方开挖、装车、运输、卸点平整主体工程	第 5-50 日历天	核心作业阶段，累计完成 30000 立方米外运
第四阶段	地块精细化平整、现场清理、临建设施拆除、竣工资料整理	第 53-59 日历天	完成全部收尾工作，提交验收申请
第五阶段	配合招标人竣工验收、问题整改、资料移交	第 60 日历天	完成项目验收交付

缓冲工期	应对雨天、环保管控、不可抗力等突发情况	3日历天	包含在总工期内，不额外延长工期
------	---------------------	------	-----------------

进度管控措施：

- (1) 建立每日进度例会制度，当日工作当日复盘，若出现进度滞后，立即增加设备、人员投入，调整作业班次，追回滞后工期；
- (2) 每周向招标人提交进度周报，汇报本周完成情况、下周计划、需协调解决的问题，接受招标人监督；
- (3) 提前预判雨天、环保管控等影响工期的因素，制定应对预案，合理调整作业计划，确保总工期不受影响；
- (4) 配备备用设备、备用人员，若出现设备故障、人员缺勤，立即补充，确保作业不中断。

三、设备配置清单


设备配置清单

单位全称（公章）：上海汪太市政工程有限公司

标项：标项1

序号	设备名称	型号规格	数量	设备使用年限	已使用时间	设备来源 (本单位所有/租赁)	备注
1	履带式挖掘机	200 型	5 台	10 年	3 年	本单位所有	带破碎锤，性能完好
2	密闭式渣土运输车辆	重型自卸车	50 台	10 年	3 年	本单位所有	具备上海市渣土运输资质，安装GPS、密闭装置、行车记录仪

3	推土机	TQ160A 型	2 台	10 年	2 年	本单位所有	用于卸点土方推平、场地平整
4	压路机	20t 单 钢轮	1 台	10 年	3 年	本单位所有	用于土方压实、场地平整
5	洒水车	10 吨	2 台	10 年	2 年	本单位所有	用于施工现场、运输路线洒水降尘、保洁
6	高压洗车设备	全自动 工程洗车机	2 套	10 年	1 年	本单位所有	用于施工现场出入口车辆冲洗
7	雾炮机	30 米射程	4 台	10 年	1 年	本单位所有	用于土方开挖、装车作业降尘
8	RTK 测量设备	华测 X6	2 套	10 年	2 年	本单位所有	用于现场测量、标高复核
9	装载机	50 型	2 台	10 年	3 年	本单位所有	用于场地清理、土方归集、应急抢险
10	应急发电机组	50kw	1 台	10 年	2 年	本单位所有	用于施工现场应急供电
11	消防器材	干粉灭火器、 消防沙	20 套	10 年	全新	本单位所有	用于施工现场消防安全
12	急救箱	含担架、急救药品、心肺复苏仪	2 套	10 年	全新	本单位所有	用于现场应急救援

全权代表签名: 

日期: 2026. 9. 1

标项: 标项 1

磋商文件要求	响应文件响应	偏离情况
负责土方开挖、装车、密闭运输、卸点摊铺平整；办理全部渣土、道路运输报备手续，承担全部费用	完全响应，我方将完成开挖装车密闭运输、卸点摊铺平整，办理全部法定报备手续，承担全部费用	无偏离
工期：合同签订后按甲方指令开工，总工期 60 日历天，服从采购人进度	承诺响应总工期 60 日历天，服从采购人开工指令与总体进度安排	无偏离
外运土方土质满足属地卸点回填，禁止建筑垃圾、污染土外运，不合格土方自行运回承担费用	完全响应，外运前做好土质甄别，不合格土方无条件运回，全部费用自行承担	无偏离
严格执行上海渣土、扬尘、文明施工，车辆出场冲洗，严禁带泥上路，承担全部违规处罚责任	完全响应，落实出场冲洗、扬尘降噪，承担全部违规处罚及协调工作	无偏离

日期：2026.9.1

五、施工组织方案及人员安排

（一）工期保证施工组织方案

严格执行本项目 60 日历天总工期目标，五大阶段交叉流水作业；设置 3 日历天缓冲工期，应对降雨、环保管控、设备故障等风险。

1. **组织保障：**项目负责人统一统筹进度管理，每日进度例会，动态跟踪土方完成方量；每周向采购人报送进度周报。
2. **资源保障：**挖掘机、渣土车配置备用设备；储备机动作业人员，设备故障、人员缺勤第一时间替补，保障作业不间断。
3. **天气及外部风险预案：**雨天提前做好场地排水；收到管控停工通知时做好现场防护，管控解除后增加作业班次追回工期损失。
4. **误期违约承诺：**若我方原因造成工期延误，愿意按照合同约定，每延期一日按合同价 0.5% 承担误期赔偿，误期赔偿最高不超过合同价 5%，达到限额采购人有权终止合同。

（二）人员安排

建立完整项目管理组织架构，所有项目管理人员为本单位在职人员，全部经过安全、合规、技术交底培训考核合格上岗。

1. **项目负责人：**建筑工程二级注册建造师，全面统筹项目，对接采购人、监理、属地村委，总体把控安全、质量、工期。
2. **技术负责人：**负责施工方案落地、测量复核、技术交底、土方开挖标高控制。
3. **安全员：**专职现场安全管理，落实安全巡检、扬尘文明施工检查，安全隐患排查整改。
4. **质量员：**负责开挖标高复核、土方土质检查、卸点平整质量验收，留存测量记录。
5. **现场调度：**现场人机调度，渣土车辆统筹，GPS 监控运输状态，运输台账登记。
6. **特种作业人员：**挖掘机驾驶员、渣土车驾驶员、推土机压路机操作员，全部持证上岗。
7. **辅助作业人员：**装车辅助工、现场保洁、卸点现场指挥人员。

六、项目负责人简历表

项目负责人简历表

姓 名	胡威	出生年月	1989 年 3 月 18 日	学 历	本科
职 称	无	职 务	经理	拟在本工程任职	项目负责人
注册建造师执业资格等级			二级	建造师专业	建筑
安全生产考核合格证书			沪建安 B(2023)0109753		
毕业学校	2010 年毕业于 四川大学 学校 土木工程 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类 似项目名 称	担任职务	工程概况说明	发包人及联系电话	
2024 年	金汇镇泰日社区 01D-02 地块的土方开挖和外运	项目经理	土方外运	翁卫忠 13311831586	
2025 年	上海市之奉贤新城 23 亩 项目土方工程	项目经理	土方外运	卢于隆 13916903595	
2024 年	奉贤区庄行镇 FXS3-0101 单元 36-03 地块征收安 置房项目土方施工工程	项目经理	土方外运	杨经理 13681769242	

注：1、格式可自拟；
2、应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书。

附：项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证书

1. 项目负责人注册建造师证书

	
中华人民共和国二级建造师注册证书	
姓 名：胡威	
性 别：男	
出生日期：1989年03月18日	
注册编号：沪2312015202512918	
聘用企业：上海汪太市政工程有限公司	
注册专业：建筑工程（有效期：2025年07月04日至2028年07月03日）	
	
	
个人签名：	
签名日期：	
注册人员最新信息请关注 微信公众号“上海建筑业”扫一扫查询	住房和城乡建设管理委员会 签发日期 2025年07月07日

2. 安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人	
安全生产考核合格证书	
编号:沪建安B(2023)0109753	
姓 名: 胡威	
性 别: 男	
出 生 年 月: 1989年03月18日	
企 业 名 称: 上海汪太市政工程有限公司	
职 务: 项目负责人(项目经理)	
初次领证日期: 2022年09月29日	
有 效 期: 2025年09月01日 至 2028年09月27日	
	发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会
	发证日期: 2025年09月01日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

七、项目人员配置相关资料

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：上海江太市政工程有限公司

标项：标项1

序号	姓名	年龄	在项目组 中的岗位	学历和毕 业时间	职称及职业 资格	进入本 单位时 间	联系方 式
1	胡威	37	项目经理	本科	沪 2312015202 512918	2019 年 3 月	133912 76526
2	胡元婷	38	安全员	本科	沪建安 C3(2022)00 62779	2018 年 8 月	182212 54332
3	桑双双	30	资料员	本科	1042411400 001000409	2018 年 8 月	150212 51513
4	惠路新	27	标准员	本科	1042411500 001000173	2020 年 5 月	185162 06520
5	姚传贺	38	施工员	专科	1042410100 001000578	2018 年 8 月	130416 66582
6	徐宾	39	质量员	中专	1012410600 003000283	2018 年 8 月	187211 72958

注：在填写时，如本表格不适合磋商响应单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：周杰 日期：2026.9.1

附：职业资格证书

	
中华人民共和国二级建造师注册证书	
姓 名：胡威	
性 别：男	
出生日期：1989年03月18日	
注册编号：沪2312015202512918	
聘用企业：上海汪太市政工程有限公司	
注册专业：建筑工程（有效期：2025年07月04日至2028年07月03日）	
	
注册人员最新信息请关注 微信公众号“上海建筑业”扫一扫查询	
个人签名： 胡威	上海市 住房和城乡建设管理委员会 签发日期 2025年07月07日
签名日期：	

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3 (2022) 0062779

姓 名: 胡元婷

性 别: 女

出 生 年 月: 1988年02月12日

企 业 名 称: 上海汪太市政工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2022年06月30日

有 效 期: 2025年03月31日 至 2028年06月28日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2025年03月31日



证书编码: 1042411400001000409

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 桑双双

身份证号: 342423199601016807

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年08月12日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

证书编码: 1042411500001000173

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 惠路新

身份证号: 342225199207181566

岗位名称: 标准员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年08月12日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

证书编码: 1042410100001000578

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 姚传贺

身份证号: 342423198810226814

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年08月12日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

证书编码: 1012410600003000283

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 徐宾

身份证号: 342222198708200194

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2024年10月17日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

八、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施

（一）技术服务措施

1. **前期技术交底服务：**开工前对全部作业人员开展项目专项技术交底，明确开挖标高、卸点摊铺标准、运输路线、土质管控要求。
2. **现场全过程技术服务：**技术负责人常驻现场，开展测量复核；针对采购人、监理提出技术调整要求及时响应调整。
3. **问题整改响应：**收到采购人、监理、属地村委整改通知，我方人员 1 小时内到场，按要求限时完成整改闭环。
4. **资料服务：**施工全过程同步整理测量记录、运输台账、影像资料，竣工后完整移交全套竣工资料。

（二）售后服务及质保承诺

1. 本项目完工竣工验收交付后，若因我方施工原因出现卸点沉降、场地遗留土方等问题，我方接到通知后及时到场免费处置。
2. 项目实施期间发生城管、交通、环保处罚，全部责任、罚金由我方承担；发生村民投诉，我方第一时间到场协调化解。
3. 不合格土方处置承诺：一旦检出不合格回填土质，我方无条件运回处置，产生一切费用自行承担。

（三）服务质量管理体系

1. **质量目标：**确保本项目土方清运、场地平整工程一次性验收合格率 100%，零质量投诉，完全符合招标文件、测绘报告及招标人要求，满足国家及上海市相关行业标准。
2. **质量管理组织架构：**成立以项目负责人为组长，技术负责人、质量员为副组长，各作业班组长为成员的质量管理小组，全面负责项目质量管控工作，明确各岗位质量职责，签订质量责任书，将质量责任落实到个人。
3. **技术交底制度：**项目开工前，由技术负责人组织全员进行技术交底，明确项目质量标准、开挖标高、平整要求、验收规范、作业流程等关键技术要求，对重点、

难点工序进行专项交底，所有作业人员考核合格后方可上岗，交底记录签字归档。

4. **三检制度：**严格执行“自检、互检、交接检”三检制度，每道工序完成后，作业班组先进行自检，自检合格后，由质量员与下道工序班组进行互检、交接检，验收合格后方可进入下道工序施工，未经检验合格的工序，严禁进入下一步作业。

5. **测量复核制度：**配备专业测量人员及 RTK 测量设备，每日对开挖标高、场地平整度进行测量复核，严格控制开挖深度，严禁超挖、欠挖，每日形成测量记录，由技术负责人审核签字，报招标人备案，确保开挖精度符合设计要求。

6. **质量巡检制度：**质量管理小组每日对施工现场进行全覆盖质量巡检，重点检查开挖标高、场地平整质量、土方装载质量、卸点平整质量等，对发现的质量问题，立即下达整改通知书，明确整改时限、整改责任人，整改完成后复检验收，形成质量巡检台账，对重复出现的质量问题，严肃追究相关责任人责任。

7. **验收管理制度：**严格按照招标文件规定的验收标准，分阶段开展验收工作，包括地表清理验收、开挖过程中阶段性验收、竣工预验收、竣工验收，每阶段验收合格后，方可进入下一阶段工作；竣工后，整理全部质量资料，提交招标人验收，全力配合招标人及第三方机构的验收工作，对验收提出的整改意见，立行立改，直至验收合格。

8. **质量追溯制度：**建立项目质量全流程追溯台账，对每道工序的作业人员、作业时间、质量检验情况、测量数据等进行详细记录，实现质量问题可追溯、责任可落实，确保项目质量全程可控。

（四）安全生产管理制度

1. **安全生产目标：**杜绝死亡、重伤事故，杜绝重大机械设备事故、重大交通事故责任事故、火灾事故，轻伤事故发生率控制在 0‰，实现“零事故、零伤亡”的安全生产目标。

2. **安全生产责任制：**建立“全员、全过程、全方位”的安全生产责任制，明确项目负责人为项目安全生产第一责任人，专职安全员为现场安全直接责任人，各作业班组长、作业人员为各自岗位安全生产直接责任人，签订安全生产责任书，将安全生产责任层层分解，落实到每个岗位、每个人员。

3. **安全教育培训制度：**项目开工前，组织全员开展三级安全教育培训，包括国家

安全生产法律法规、项目安全管理制度、岗位安全操作规程、应急处置技能等内容，培训后进行考核，考核不合格者严禁上岗；项目实施期间，每周开展一次安全例会，每日开展班前安全技术交底，针对当日作业内容，明确安全风险、安全注意事项，交底记录签字归档；定期开展特种作业人员、驾驶员专项安全培训，严禁无证上岗、违章作业。

4. **安全检查制度：**专职安全员每日对施工现场、运输车辆、作业设备进行全覆盖安全巡查，重点排查机械作业、车辆运输、临时用电、临建设施、消防设施、扬尘管控等方面的安全隐患，对发现的安全隐患，立即下达隐患整改通知书，按照“定人、定时间、定措施”的要求整改，整改完成后复验验收，形成安全隐患排查整改台账，对重大安全隐患，立即停止作业，整改合格后方可复工；项目负责人每周组织一次全面安全生产大检查，对安全管理情况进行全面复盘，及时消除安全隐患。

5. **特种作业管理制度：**挖掘机驾驶员、渣土运输车辆驾驶员、电工、焊工等特种作业人员，必须持有效的特种作业操作证上岗，严禁无证人员从事特种作业；建立特种作业人员台账，对人员资质、证件有效期进行动态管理，证件过期的严禁上岗作业。

6. **车辆运输安全管理制度：**建立运输车辆“一车一档”台账，定期对车辆进行检修、保养，确保车辆制动、转向、灯光、密闭装置、GPS 设备、行车记录仪等性能完好，严禁车辆带病上路；驾驶员必须持有效的驾驶证、从业资格证上岗，严禁超速、超载、闯红灯、酒后驾驶、疲劳驾驶，严禁无证驾驶；每日出车前，对驾驶员进行安全交底，收车后对车辆进行全面检查，建立车辆运输、检修、违章台账，对发生交通违章的驾驶员，进行严肃处理、重新培训，多次违章的，立即调离岗位。

7. **现场作业安全管理制度：**施工现场设置连续封闭围挡、安全警示标识、施工公示牌，严禁非作业人员进入施工区域；机械作业时，设置专人指挥，作业半径内严禁站人，严禁违章指挥、违章作业；施工现场临时用电严格执行“三级配电、两级保护”制度，严禁私拉乱接电线，电工必须持证上岗，每日对用电线路、设备进行检查，确保用电安全；施工现场严禁吸烟，配备充足的消防器材，严禁明火作业，确需明火作业的，必须办理动火审批手续，落实防火措施，安排专人监护。

8. **安全事故报告与处理制度：**发生安全事故，立即启动应急方案，组织救援，防止事故扩大，同时第一时间上报招标人及相关主管部门，不得迟报、瞒报、漏报；按照“四不放过”的原则，对事故原因进行调查，追究相关责任人责任，制定整改

措施，防止同类事故再次发生。

（五）文明施工与环境保护管理制度

1. **文明施工目标：**严格遵守上海市及临港新片区文明施工管理规定，实现施工现场标准化、规范化管理，零城管处罚、零环保投诉、零周边居民投诉，创文明施工示范工地。

2. **施工现场封闭管理制度：**施工现场沿地块边界设置连续、封闭的硬质围挡，围挡高度不低于 2.5 米，围挡表面整洁、美观，张贴安全警示、文明施工标识，严禁围挡破损、污损；施工现场出入口设置大门，配备门卫值守人员，严禁无关人员、车辆进入施工现场，出入口设置施工公示牌，公示项目名称、建设单位、施工单位、项目负责人、工期、安全举报电话等信息。

3. **施工现场保洁管理制度：**施工现场出入口设置标准化洗车台、高压冲洗设备、三级沉淀池，运输车辆出场前，必须对车轮、车身、底盘进行全面冲洗，确保不带泥上路，冲洗废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，严禁污水未经处理直接外排；施工现场安排专职保洁人员，每日对场地、便道进行清扫、洒水降尘，保持场地整洁，无积水、无垃圾、无扬尘；运输车辆全程密闭，严禁车厢未密闭出场，杜绝运输过程中渣土撒漏。

4. **扬尘污染防治管理制度：**严格落实《上海市扬尘污染防治管理办法》，制定专项扬尘管控方案，施工现场采取“围挡、喷淋、冲洗、遮盖、洒水”五位一体降尘措施；沿围挡内侧安装全自动喷淋降尘系统，每日定时开启喷淋，土方开挖、装车作业时，开启雾炮机全程降尘，干燥天气、大风天气增加洒水、喷淋频次；裸露土方、闲置场地采用防尘网全覆盖，严禁土方裸露堆放；严禁在施工现场焚烧垃圾、废料，杜绝扬尘污染源。

5. **噪声污染防治管理制度：**严格控制施工噪声，选用低噪声机械设备，对高噪声设备采取减振、降噪措施；合理安排作业时间，除经审批的夜间施工外，每日 22:00 至次日 6:00 严禁开展高噪声作业，避免影响周边居民休息；若因工期需要确需夜间施工，提前办理夜间施工许可手续，公告周边居民，落实降噪措施，最大限度降低施工噪声影响。

6. **水土保持与排水管理制度：**施工现场设置连续、通畅的排水沟、集水井、沉淀

池，确保雨水、施工废水有序排放，经沉淀后回用，严禁未经处理的污水直接排入市政管网、周边河道；对施工现场边坡采取防护措施，防止水土流失，严禁施工泥浆、渣土堵塞市政排水管网、河道。

7. **废弃物处置管理制度：**施工现场产生的生活垃圾、建筑垃圾、废弃油料等废弃物，分类归集、密闭存放，委托合规单位清运处置，严禁随意倾倒、填埋；土方严格按照招标人指定的卸点合规倾倒，严禁随意倾倒、私拉乱倒，确保所有废弃物全流程合规处置。

8. **周边关系协调管理制度：**主动与周边社区、居民、单位对接，提前告知施工计划、工期安排，公布项目负责人联系电话，畅通沟通渠道；定期走访周边居民，听取意见建议，及时优化施工方案，化解矛盾纠纷，营造良好的施工环境，严禁与周边居民发生冲突。

（六）人员保障措施

1. **人员选拔配置：**为本项目配置经验丰富、资质齐全、能力过硬的项目管理团队及作业人员，项目负责人具备5年以上土方工程项目管理经验，持有注册建造师证书、安全生产考核合格证书，具备多个同类型项目管理业绩；技术负责人、专职安全员、质量员均具备相应岗位证书及3年以上同类型项目工作经验；挖掘机驾驶员、运输车辆驾驶员均持有效证件上岗，具备3年以上相关作业经验，无重大责任事故记录，所有人员均经过严格筛选，确保完全满足项目实施需求。

2. **人员培训体系：**建立三级培训体系，项目开工前，开展全员岗前培训，包括技术、安全、合规、文明施工、应急处置等内容，考核合格后方可上岗；项目实施期间，每周开展专项技能培训、安全培训，每月开展应急演练，持续提升作业人员专业技能、安全意识、应急处置能力；定期开展法律法规、行业规范培训，确保全员熟悉上海市渣土运输、安全生产、环境保护相关规定，做到合规作业。

3. **人员管理制度：**建立全员岗位责任制，明确每个岗位的职责、工作标准、考核要求，签订岗位责任书；严格执行考勤制度，项目负责人、专职安全员全程驻场，作业人员全勤在岗，严禁擅自离岗、脱岗；建立人员动态管理台账，对人员资质、培训情况、考勤情况、作业表现进行动态管理，未经招标人书面同意，不得擅自更换项目负责人及主要管理人员；对违规作业、不服从管理、考核不合格的人员，立即调离岗位，严肃处理。

4. **人员激励与保障措施：**为作业人员提供完善的食宿、劳保、安全防护保障，足额缴纳社会保险、人身意外伤害保险，按时足额发放工资，绝不拖欠农民工工资；建立绩效考核制度，将作业质量、安全、效率、合规情况与绩效挂钩，对表现优秀的人员给予奖励，充分调动人员积极性；定期开展人员关怀，关注作业人员身体状况、心理状态，合理安排作业班次，杜绝疲劳作业，确保人员以良好的状态投入工作。

（七）档案管理制度

1. **档案管理目标：**确保项目档案资料完整、准确、系统、规范，实现项目全流程可追溯，满足招标人、档案管理部门、行业主管部门的归档要求，验收后一次性移交合格。

2. **档案管理岗位职责：**指定专职档案管理员，负责项目全过程资料的收集、整理、归档、保管、移交工作，明确档案管理职责，确保档案资料全程可控。

3. **资料收集范围：**全面收集项目实施全过程的所有资料，包括但不限于：

- （1）招投标文件、中标通知书、合同文件、相关审批手续文件；
- （2）施工组织设计、专项方案、技术交底、安全交底资料；
- （3）测量记录、放线记录、土方量核算记录、质量检验、验收资料；
- （4）安全隐患排查整改记录、安全教育培训记录、应急演练记录；
- （5）设备检修台账、车辆运输台账、人员考勤、培训记录；
- （6）施工现场影像资料、每日进度报表、周报、月报；
- （7）与招标人、监理单位、行业主管部门的往来函件、会议纪要；
- （8）竣工验收资料、竣工报告、结算资料、整改记录等。

4. **档案整理规范：**严格按照上海市城建档案管理规范、招标人归档要求，对收集的资料进行分类、编号、装订，纸质资料与电子资料同步归档，确保资料内容完整、签字盖章齐全、数据准确、前后一致，无涂改、无缺失；建立档案目录索引，便于查阅、检索。

5. **档案保管制度：**施工现场设置专用档案柜，配备防潮、防火、防盗、防虫设施，确保档案资料安全存放；建立档案查阅、借阅制度，查阅、借阅档案必须履行登记手续，严禁擅自涂改、损毁、丢失档案资料；电子档案采用双备份存储，定期备份，防止数据丢失。

6. **档案移交制度：**项目竣工验收合格后，按照招标人要求的时间、份数、格式，整理完成全套竣工档案资料，编制移交清单，向招标人办理移交手续，双方签字确认；同时按要求向城建档案管理部门移交相关档案资料，确保项目档案归档闭环。

（八）进度管理制度

1. **进度总目标：**严格按照合同约定的 45 个自然日总工期，完成项目全部工作内容，确保按期竣工验收交付，绝无工期延误。
2. **进度计划管理：**根据总工期要求，编制详细的总进度计划、分阶段进度计划、周进度计划、日作业计划，明确每个阶段的工作内容、完成时间、责任人、所需资源，将总工期目标层层分解，落实到每日、每个班组、每个岗位。
3. **进度动态管控：**建立每日进度例会制度，当日作业结束后，召开进度复盘会，核对当日计划完成情况，分析进度滞后原因，制定整改措施，次日追回滞后工期；每周向招标人提交进度周报，汇报本周完成情况、下周进度计划、需协调解决的问题，接受招标人监督；若进度滞后超过计划的 10%，立即启动预警机制，增加人员、设备投入，调整作业班次，确保在 2 日内追回滞后工期，绝不影响总工期。
4. **资源保障措施：**根据进度计划，提前配置充足的人员、机械设备、物资，确保资源投入与进度计划匹配；配备备用设备、备用人员，应对设备故障、人员缺勤等突发情况，确保作业不中断；提前预判天气、环保管控等影响工期的因素，制定应对预案，合理调整作业计划，确保总工期不受影响。
5. **进度协调机制：**建立与招标人的日常对接机制，每日汇报现场进度情况，及时沟通需招标人协调解决的问题；主动对接行业主管部门、交警部门、卸点管理单位，提前办理相关手续，协调解决运输路线、卸点倾倒等问题，确保项目顺利推进，避免因外部因素影响工期。

九、选配件、专用耗材、售后服务优惠表

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

单位全称（公章）：上海汪太市政工程有限公司 标项：标项 1

序号	优惠内容	适用机型	单价	比磋商响应报价优惠率 (%)
1	/	/	/	/
2				
3				
4				
5				
6				

全权代表签名：周杰

日 期：_____

九、其他文件和说明

为有效应对本项目实施过程中可能发生的各类突发事件，最大限度降低突发事件造成的人员伤亡、财产损失及工期影响，我方结合项目实际情况，编制专项应急方案，建立完善的应急管理体系，确保突发事件发生时能够快速响应、科学处置、有效控制。

（一）应急组织机构及职责

1. 应急领导小组

组长：项目负责人（全面统筹应急事件的决策、指挥、协调，负责上报突发事件情况）

副组长：技术负责人、专职安全员（协助组长开展应急指挥，负责现场技术指导、人员调配、应急处置方案制定）

成员：现场调度员、机械班组长、运输班组长、质量员、急救员

2. 应急小组职责分工

（1）组长：负责启动应急方案，下达应急处置指令，统筹协调内外部资源，负责与招标人、行业主管部门、应急救援部门的对接沟通，上报突发事件情况。

（2）副组长：负责现场应急处置的具体指挥，制定现场处置方案，调配应急人员、设备、物资，监督应急措施落实，及时向组长汇报处置进展。

（3）现场处置组：由机械班组长、运输班组长及作业人员组成，负责现场抢险、设备抢修、人员救援、隐患排查等具体应急处置工作。

（4）安全保卫组：由专职安全员及现场安保人员组成，负责现场警戒、人员疏散、交通疏导、保护事故现场，防止二次事故发生。

（5）医疗救护组：由持证急救员组成，负责现场人员受伤的紧急救治、心肺复苏、止血包扎，配合 120 急救人员转运受伤人员。

（6）后勤保障组：负责应急物资、设备、车辆的调配，保障应急处置过程中的物资供应、通讯畅通、后勤支持。

3. 应急值守机制：项目实施期间，应急小组成员 24 小时开机待命，项目现场设置应急值班室，每日安排专人值守，确保突发事件发生时，能够第一时间响应。

（二）突发事件风险识别

本项目实施过程中主要的突发事件包括：安全生产事故类、工期延误类、环保与合规类、自然灾害类、设备故障类、社会稳定类六大类，具体包括：

1. 安全生产事故：人员伤亡事故、机械伤害事故、车辆交通事故、坍塌事故、触电事故、火灾事故等；
2. 工期延误风险：极端天气、环保管控、交通管制、设备故障、人员缺勤等导致工期滞后；
3. 环保与合规风险：扬尘污染投诉、渣土撒漏处罚、违规运输查处、卸点无法正常倾倒等；
4. 自然灾害：台风、暴雨、雷电、高温、寒潮等极端天气引发的灾害；
5. 设备故障：挖掘机、运输车辆、洒水车等主要设备突发故障，无法正常作业；
6. 社会稳定风险：周边居民投诉、阻工，运输路线交通事故引发的拥堵、纠纷等。

（三）各类突发事件专项处置措施

1. 安全生产事故应急处置

（1）人员伤亡事故处置

- ① 立即停止现场全部作业，第一时间拨打 120 急救电话、110 报警电话，同时向招标人上报事故情况；
- ② 医疗救护组立即对受伤人员进行紧急救治，对出血人员进行止血包扎，对骨折人员进行固定，对心跳呼吸骤停人员进行心肺复苏，严禁盲目移动重伤人员；
- ③ 安全保卫组立即封锁事故现场，设置警戒区域，疏散无关人员，保护事故现场，严禁破坏现场痕迹、物证；
- ④ 现场处置组立即排查事故隐患，切断电源、停止机械作业，防止二次事故发生；
- ⑤ 配合 120 急救人员转运受伤人员，安排专人陪同前往医院，垫付医疗费用，同步通知受伤人员家属；
- ⑥ 配合招标人、应急管理部门、公安部门开展事故调查，如实提供事故相关资料，承担全部事故责任及赔偿。

（2）车辆交通事故处置

- ① 运输车辆发生交通事故，驾驶员立即停车，开启双闪警示灯，在车后设置警示标识，保护事故现场，第一时间向项目负责人、交警部门、保险公司报案；
- ② 若有人员受伤，立即拨打 120 急救电话，对受伤人员进行紧急救治，严禁肇事逃逸；
- ③ 项目负责人接到报告后，立即派出现场处置组、安全保卫组赶赴现场，配合交警部门处理事故，疏导交通，协调转运事故车辆上的土方，避免造成道路拥堵、土方撒漏；
- ④ 若事故造成道路污染，立即安排洒水车、保洁人员对现场进行全面清理，恢复道路整洁，避免环保投诉；
- ⑤ 同步协调备用车辆补充运输力量，确保项目清运作业不受影响，事故全部责任及损失由我方承担。

(3) 机械伤害、坍塌、触电、火灾事故处置

- ① 发生机械伤害事故，立即停止设备运行，切断电源，对受伤人员进行救治，严禁盲目拆解设备救援，避免二次伤害；
- ② 发生土方坍塌事故，立即停止现场开挖作业，疏散人员，排查坍塌范围，设置警戒区域，由技术负责人制定抢险方案，采用机械配合人工清理坍塌土方，严禁冒险作业，防止二次坍塌；
- ③ 发生触电事故，立即切断电源，采用绝缘物体使触电人员脱离电源，对触电人员进行心肺复苏，同时拨打 120 急救电话，严禁徒手直接接触触电人员；
- ④ 发生火灾事故，立即切断电源，使用现场灭火器、消防沙扑救初期火灾，疏散现场人员，同时拨打 119 火警电话，严禁盲目用水扑救电气火灾、油品火灾；若火势扩大，立即组织人员撤离至安全区域，配合消防部门灭火。

2. 工期延误应急处置

- (1) 若因雨天、台风等极端天气导致无法正常作业，立即调整作业计划，天气好转后，立即增加挖掘机、运输车辆投入，采用“两班倒”24 小时作业模式，追回延误工期；
- (2) 若因环保管控、交通管制导致白天无法运输，立即办理夜间施工许可，在合规前提下开展夜间清运作业，增加作业班次，确保总工期不受影响；
- (3) 若因设备故障、人员缺勤导致作业效率下降，立即启用备用设备、备用人员，确保作业不中断，同时组织人员抢修故障设备，确保快速恢复正常作业；
- (4) 若因卸点无法正常倾倒导致运输中断，立即对接招标人，协调备用卸点，同时调整运输路线，确保土方清运正常进行，绝不影响工期；

(5) 建立工期预警机制，若单日进度滞后超过计划的 10%，立即启动工期追赶预案，增加人员、设备投入，调整作业计划，确保在 2 日内追回滞后工期，绝不影响总工期。

3. 环保与合规风险应急处置

(1) 若发生扬尘污染、噪声污染周边居民投诉，立即停止相关作业，第一时间与投诉居民沟通致歉，同时采取强化降尘措施（增加洒水频次、加密喷淋、停止高噪声作业），调整作业时间，避开居民休息时段，确保投诉妥善解决，杜绝再次发生；

(2) 若发生运输车辆渣土撒漏、带泥上路造成道路污染，立即停止该车辆运输，安排洒水车、保洁人员对污染路段进行全面清理、冲洗，恢复道路整洁，同时对驾驶员进行严肃处理、重新培训，对所有车辆进行全面检查，确保密闭装置完好、冲洗到位，杜绝此类问题再次发生；

(3) 若因违规运输被行业主管部门查处，立即配合主管部门调查处理，承担全部处罚责任，同时对相关责任人进行追责，组织全员重新开展合规培训，全面排查整改运营合规风险，确保后续全流程合规运营；

(4) 若指定卸点无法正常倾倒，第一时间向招标人汇报，同时启动备用卸点方案，对接合规的备用卸点，确保土方清运不中断，所有处置手续、费用由我方承担，绝不影响项目进度。

4. 自然灾害应急处置

(1) **暴雨、台风天气处置：**收到气象部门暴雨、台风预警后，立即停止现场开挖、运输作业，对施工现场的围挡、临建设施、机械设备进行加固，切断施工现场电源，将机械设备转移至安全区域，疏通现场排水沟，做好防积水、防坍塌措施；安排专人 24 小时值守，巡查现场情况，若发生积水、围挡倒塌、边坡坍塌，立即组织抢险处置；天气过后，立即排查现场安全隐患，清理积水、杂物，确认无安全风险后，恢复正常作业。

(2) **高温、寒潮天气处置：**高温天气，调整作业时间，避开中午高温时段，为作业人员配备防暑降温物资，现场设置休息棚，配备防暑药品，杜绝中暑事故；寒潮天气，为作业人员配备防寒保暖物资，对机械设备进行防冻保养，更换防冻机油、防冻液，确保设备正常启动，施工现场采取防滑措施，杜绝滑倒、冻伤事故。

(3) **雷电天气处置：**雷电天气，立即停止室外高空作业、机械作业，所有人员撤离至室内安全区域，严禁在树下、电线杆旁、机械设备旁停留，切断施工现场非必要电源，防止雷击触电事故，雷电过后，排查线路、设备安全，确认无隐患后恢复作业。

5. 设备故障应急处置

(1) 现场配备备用挖掘机、运输车辆、洒水车，同时与周边设备维修单位签订应急维修协议，确保设备突发故障时，能够快速抢修；

(2) 挖掘机、运输车辆等主要设备突发故障，现场维修人员立即到场排查，若为小型故障，30 分钟内现场修复；若为重大故障，无法现场快速修复，立即启用备用设备替换故障设备，确保作业不中断，同时将故障设备拖至维修厂抢修；

(3) 建立设备日常检修制度，每日开工前、收工后对所有设备进行全面检修、保养，提前排查故障隐患，更换易损件，杜绝设备带病作业，最大限度降低设备故障概率。

6. 社会稳定风险应急处置

(1) 若发生周边居民阻工、投诉事件，立即停止现场相关作业，项目负责人第一时间到场，与居民耐心沟通，了解诉求，安抚情绪，严禁与居民发生冲突；针对居民提出的合理诉求，立即采取整改措施，调整作业时间、强化降尘降噪措施，取得居民理解；若无法现场解决，立即上报招标人及属地社区、派出所，配合相关部门协调处理，确保事件快速平息。

(2) 若运输路线发生交通事故、拥堵，现场调度员立即调整运输路线，启用备用路线，同时安排人员赶赴现场，配合交警部门疏导交通，确保运输车辆正常通行，避免造成大面积拥堵。

(四) 应急保障

1. **人员保障：**应急小组成员全部经过专业应急培训，具备相应的应急处置能力，项目实施期间全员在岗，24 小时待命，确保突发事件发生时能够立即集结到位。

2. **设备物资保障：**施工现场配备充足的应急物资及设备，包括：急救箱（担架、绷带、止血药、心肺复苏仪、常用药品）、灭火器、消防沙、铁锹、镐头、应急照明设备、对讲机、抽水泵、警戒带、警示标识、备用挖掘机、备用运输车辆、洒水车、车辆维修工具及配件等，所有应急物资专人管理，定期检查、补充，确保随时可用。

3. **通讯保障：**建立应急通讯通讯录，包含应急小组成员、招标人、急救中心、火警、交警、派出所、应急管理部门等相关联系方式，现场配备对讲机，应急小组成员手机 24 小时开机，确保突发事件发生时通讯畅通。

4. **资金保障：**设立专项应急资金，专款专用，用于突发事件应急处置、医疗救治、设备抢修、抢险物资采购等，确保应急处置过程中资金充足。

5. **培训与演练：**项目开工前，组织全员开展应急培训及应急演练，针对各类突发事件开展桌面推演、现场实操演练，确保所有作业人员熟悉应急处置流程、自救互救技能，提高应急处置能力；项目实施期间，每周开展一次安全应急培训，每月开展一次应急演练。

(五) 应急上报流程

1. 突发事件发生后，现场人员第一时间向项目负责人（应急领导小组组长）报告，报告内容包括：事件发生时间、地点、类型、伤亡情况、现场情况、已采取的措施；

2. 项目负责人接到报告后，立即判断事件等级，启动相应级别的应急方案，下达应急处置指令，同时在 1 小时内将事件情况上报招标人；

3. 若发生人员伤亡、重大火灾、重大交通事故等重大突发事件，立即拨打 120、119、110 等应急救援电话，同时在 30 分钟内上报招标人，不得迟报、瞒报、漏报；

4. 应急处置过程中，及时向招标人汇报处置进展情况，事件处置完成后，向招标人提交完整的事件处置报告，包括事件原因、处置过程、整改措施、责任追究等内容。

(六) 特殊气候条件施工方案

1. 雨天施工：施工便道设置排水沟；降雨较大时暂停开挖外运；雨后复工前排查场地积水、边坡稳定性；洗车台、沉淀池做好雨水导排，防止泥水外溢。

2. 高温天气：落实作业人员防暑降温；机械定时检修；增加洒水降尘频次。

3. 重污染天气管控：接到重污染预警停工指令，立即停止土方开挖、运输作业；做好现场裸土覆盖，管控解除后迅速恢复施工追回工期。
